



HUNZIKERBETATECH

WASSER
BAU
UMWELT



29. April 2025

ARA Interlaken Faulraumsanierung und Gassystem / Schlammbehandlung

Projektvorstellung



Traktanden

- Ausgangslage / Rückblick
- Projektumfang
- Kosten
- weiteres Vorgehen



Rückblick

- Sanierungsbedarf Faulräume
- Vorstudie Methan- und Lachgasemissionen (BG)
- Variantenstudie Faulraumsanierung (Betriebskonzept während Sanierung)
- Entwurf Bauprojekt (inkl. Fassade, Statik)





Workshop Strategie

- Diskussion grundsätzlicher Fragen
- Einbezug AWA
- Weiterentwicklung Einzugsgebiet






Überprüfung, Dimensionierung, Bauprojekt







System heute

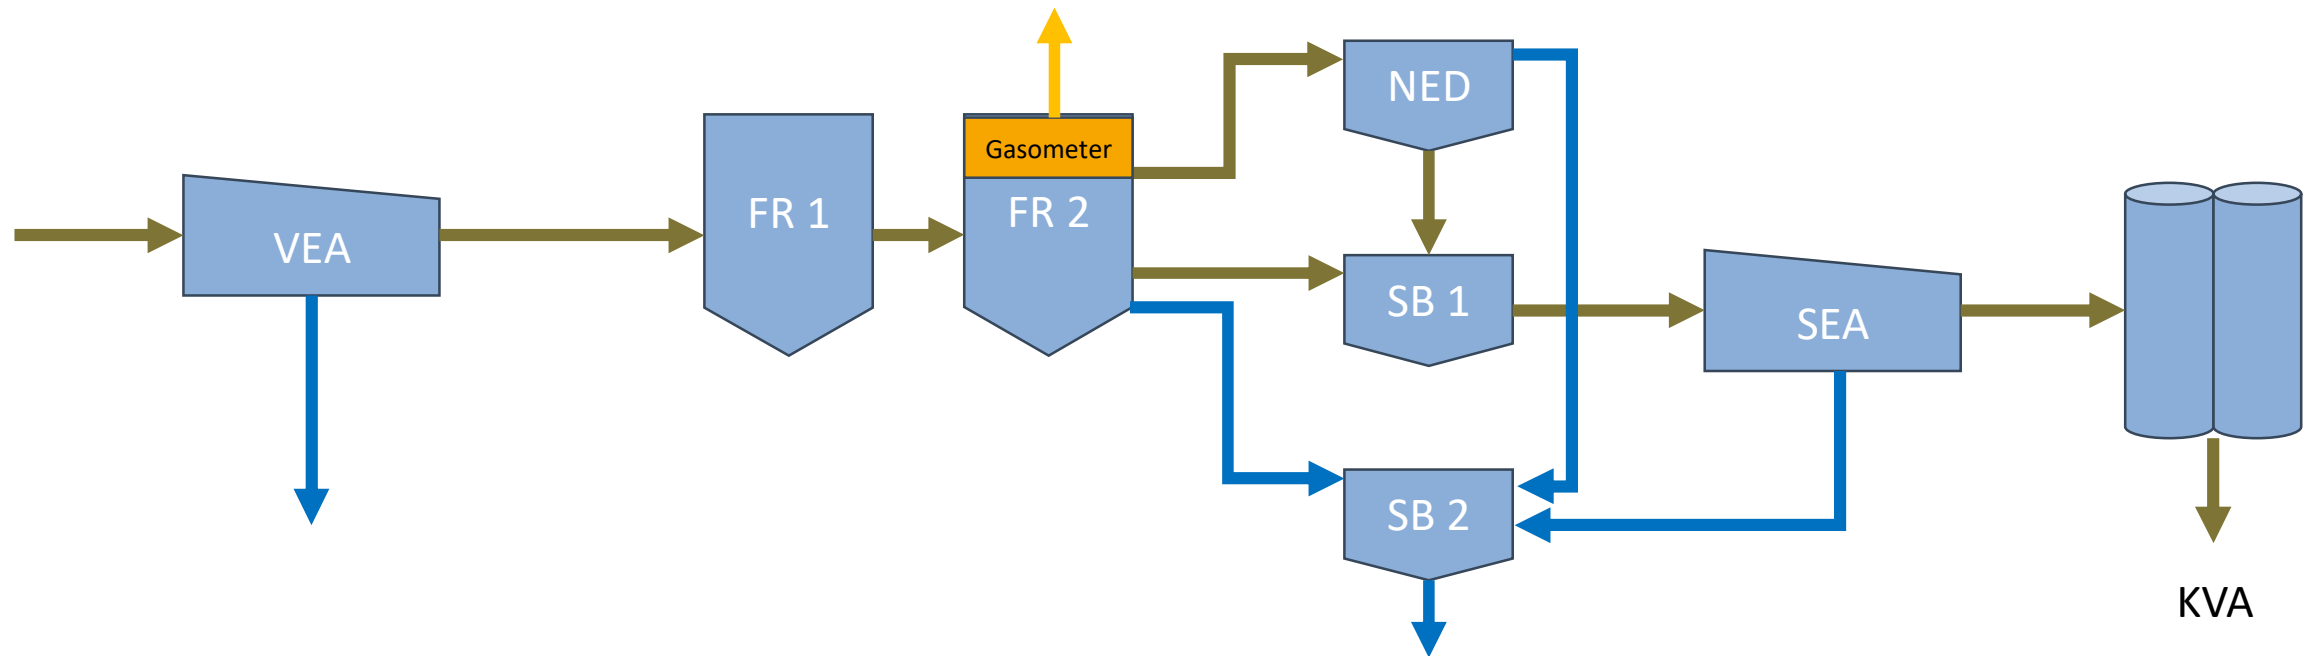




System neu

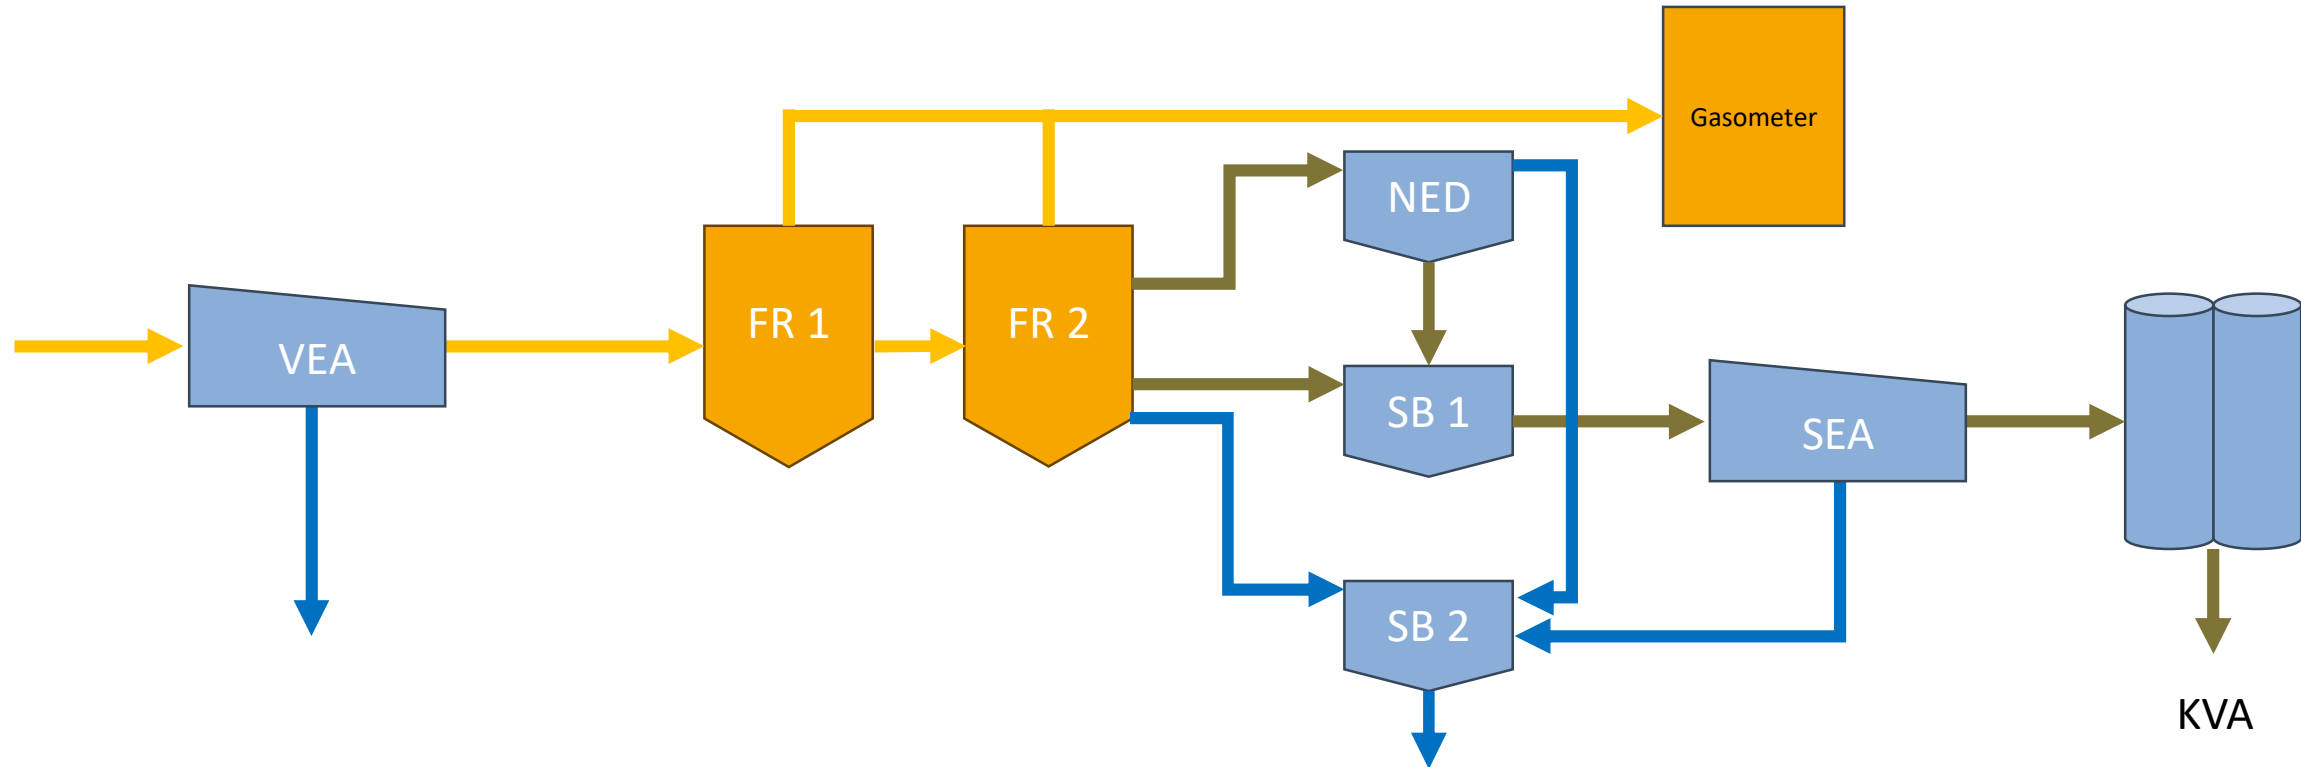

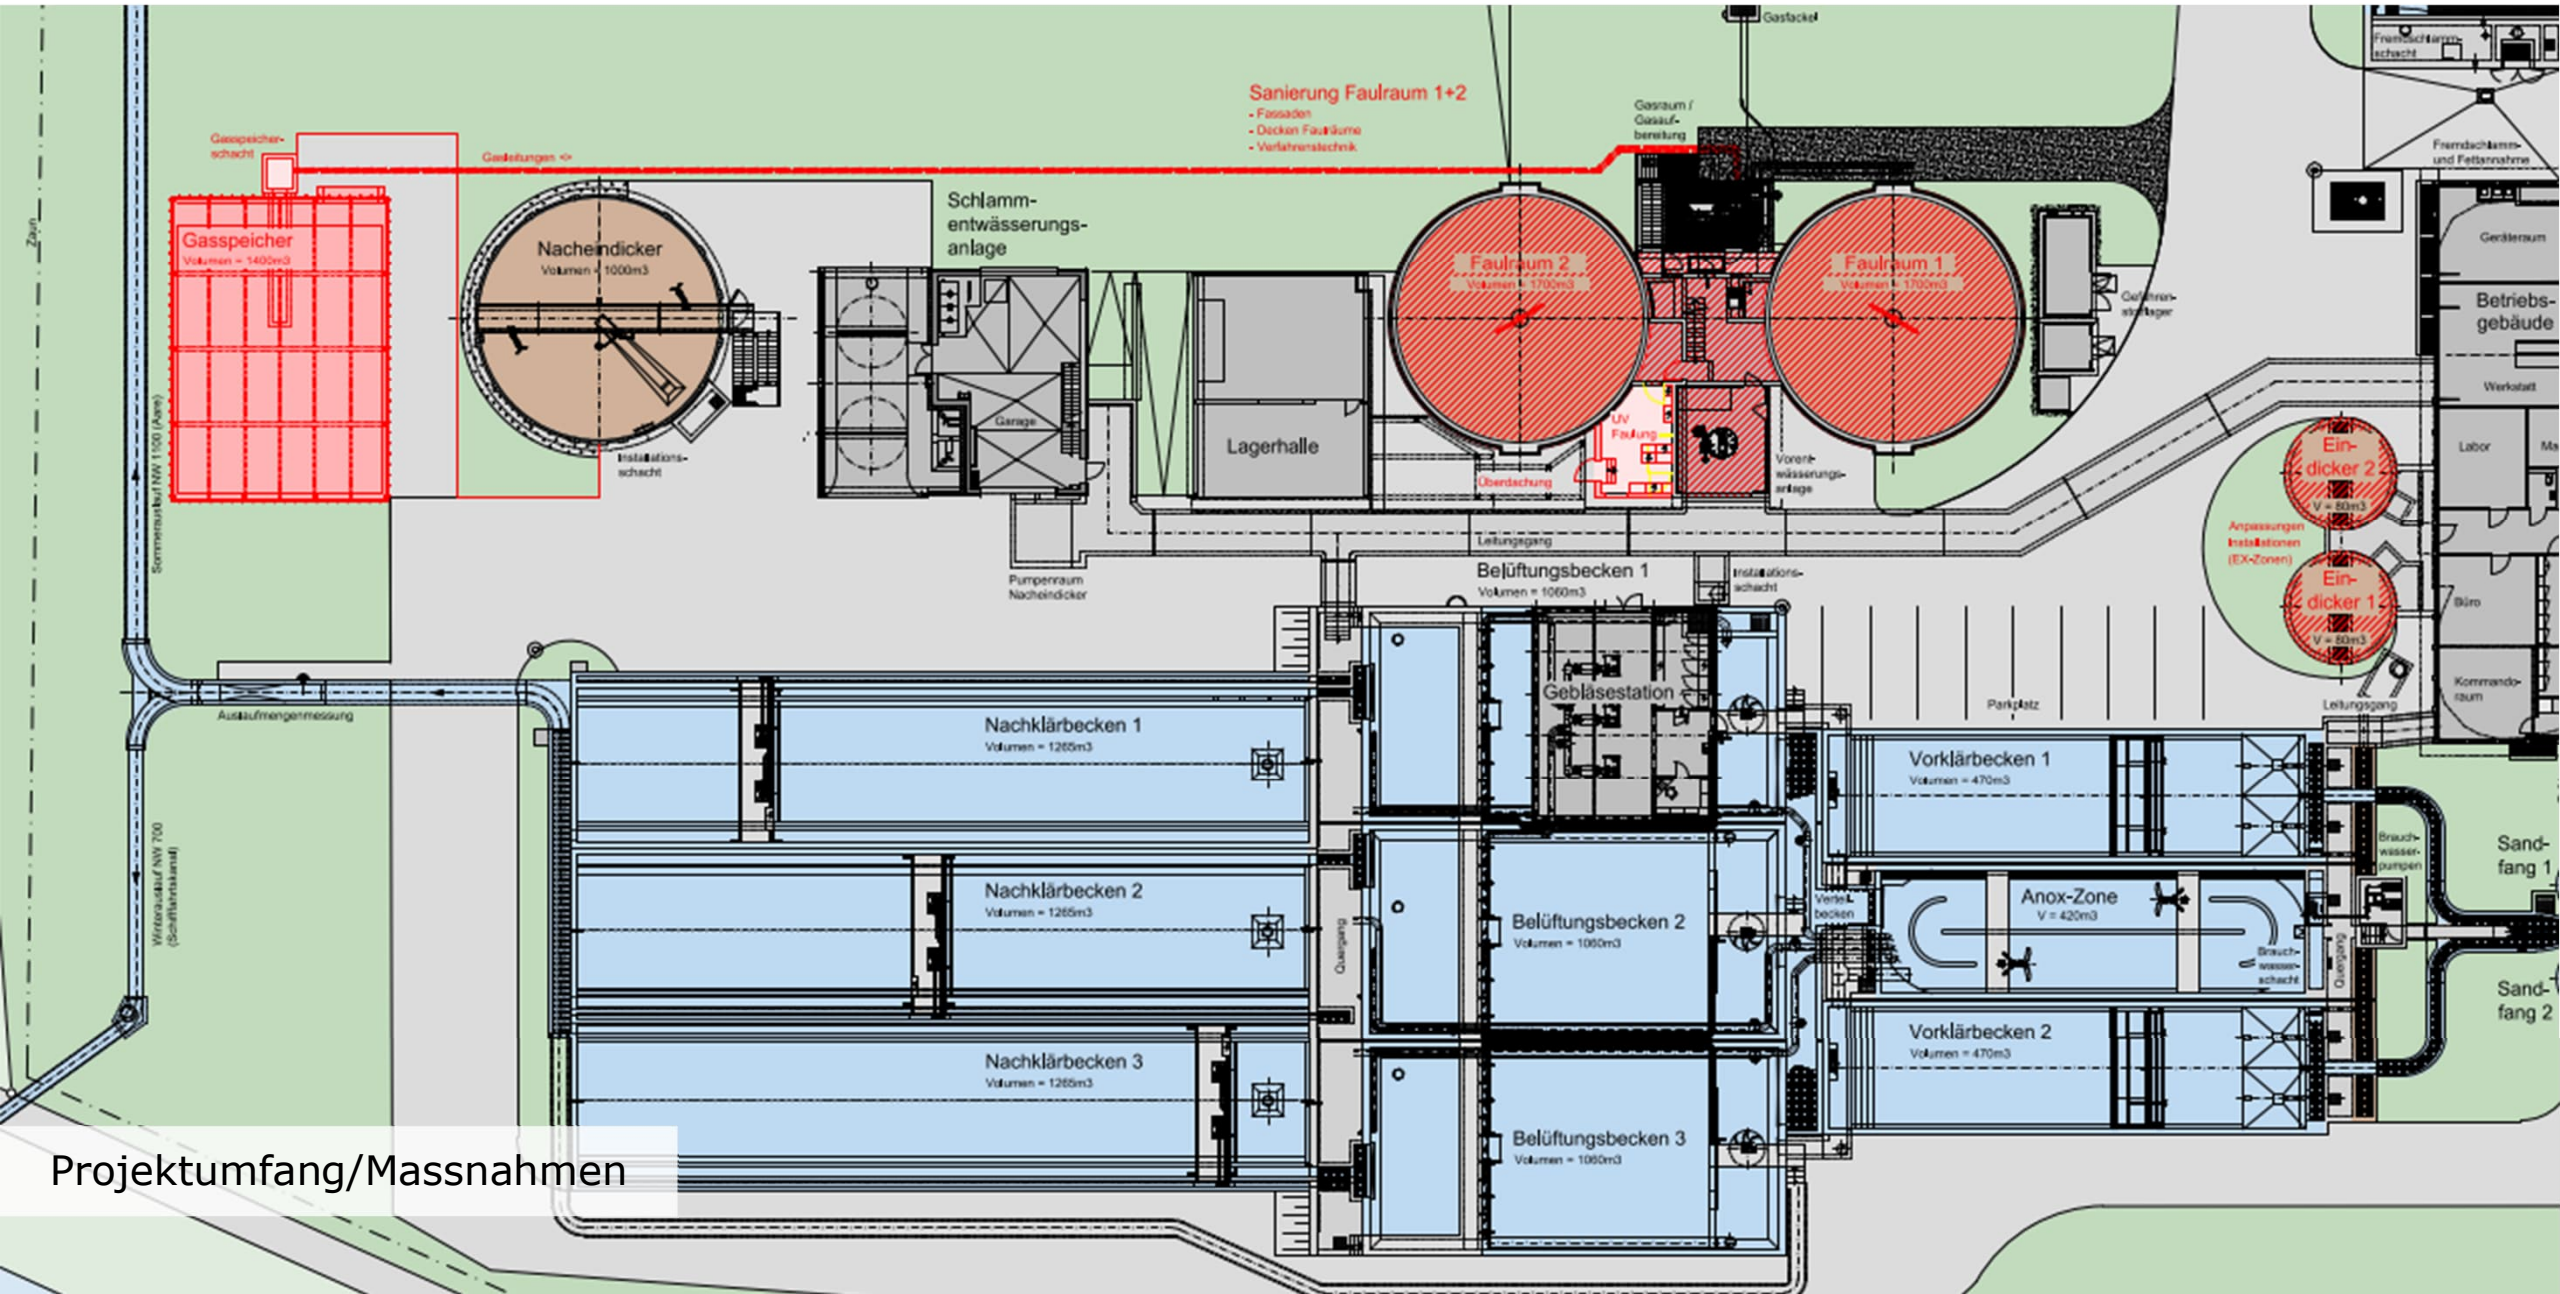

Projektumfang/Massnahmen

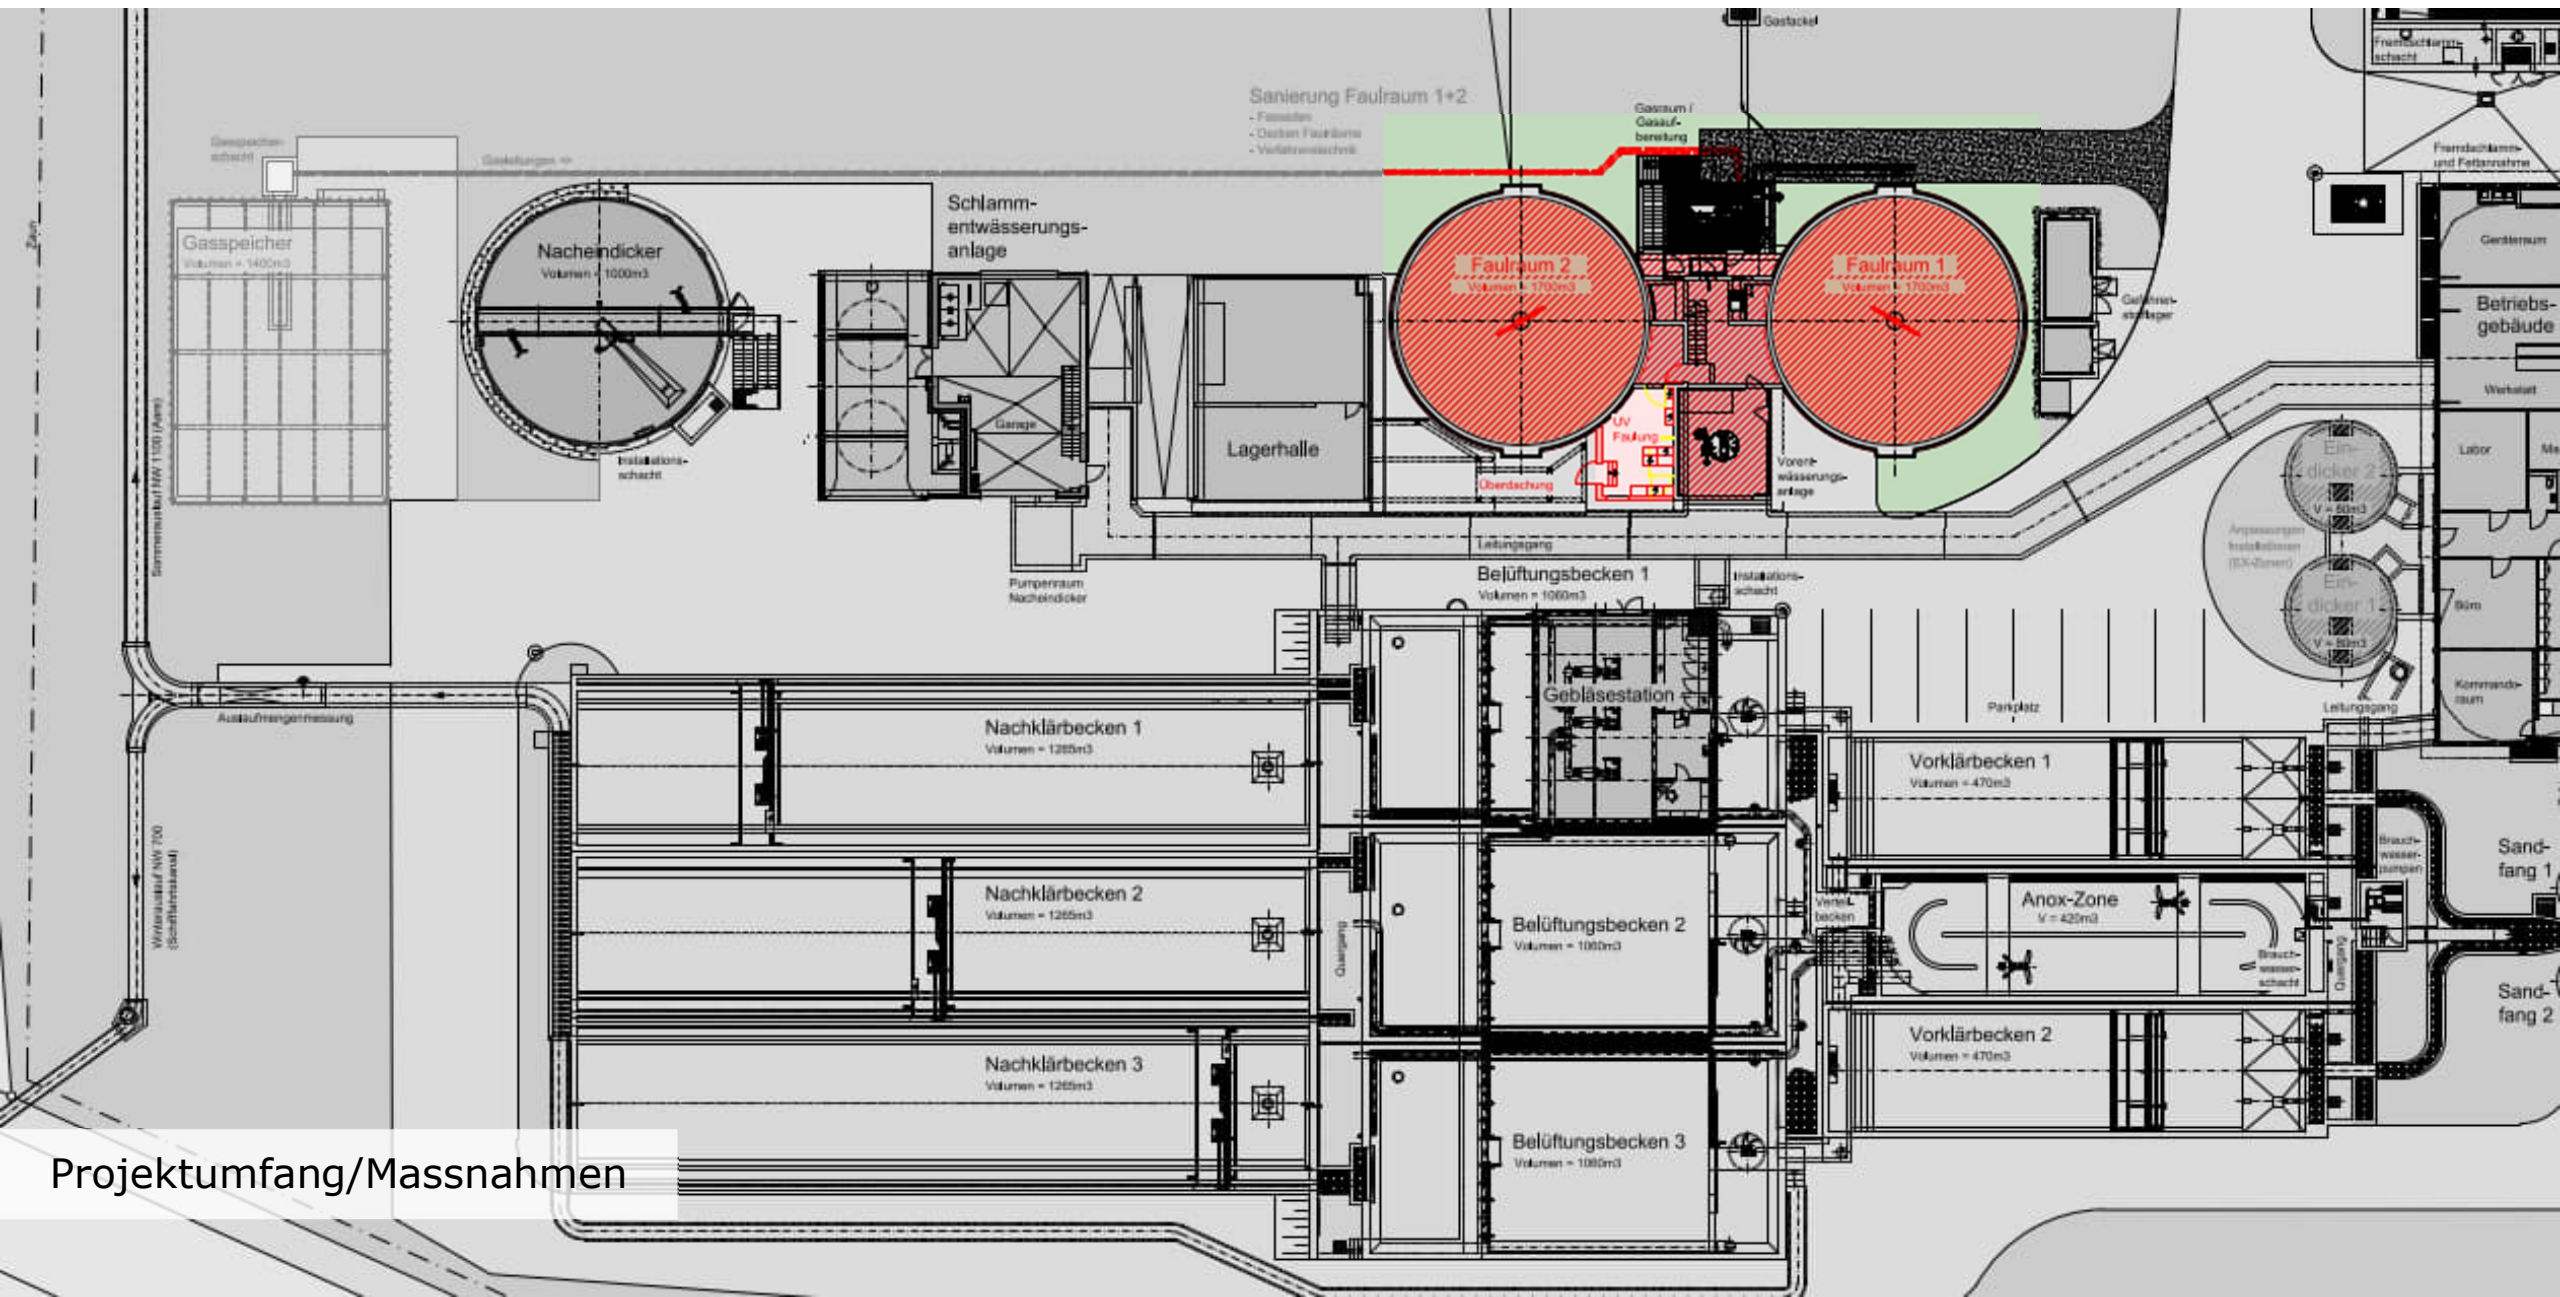

Projektumfang/Massnahmen



Geschlossene Deckel

Betoninstandsetzung

Neue Ausrüstung (Rührwerk, Leitungen)

Sanierung Isolation und Fassade

Neuer Schaltschrankraum

Faulräume



Faulräume


Heute:


- Schwimmende Deckel
- Rührwerke inkl. Motor eingetaucht
- 1 Faulraum mit integriertem Gasometer





Projekt:

- geschlossene Deckel
- Rührwerke eingetaucht, Motor zugänglich
- Baugleiche Faulräume

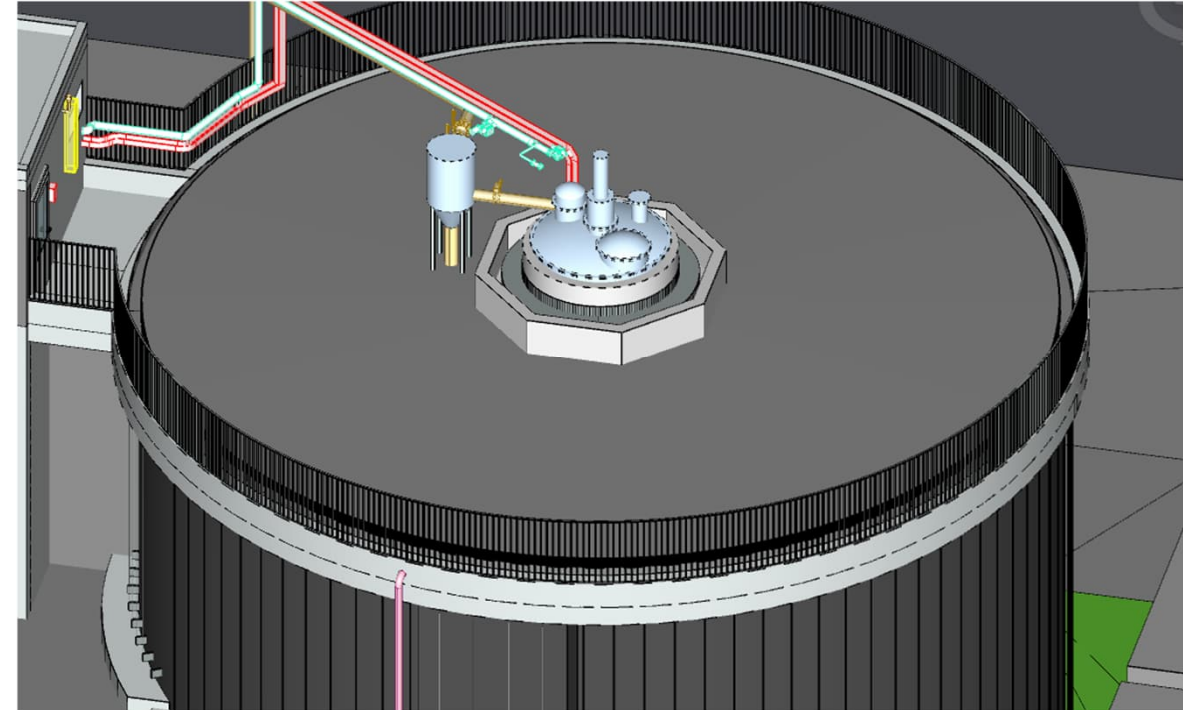


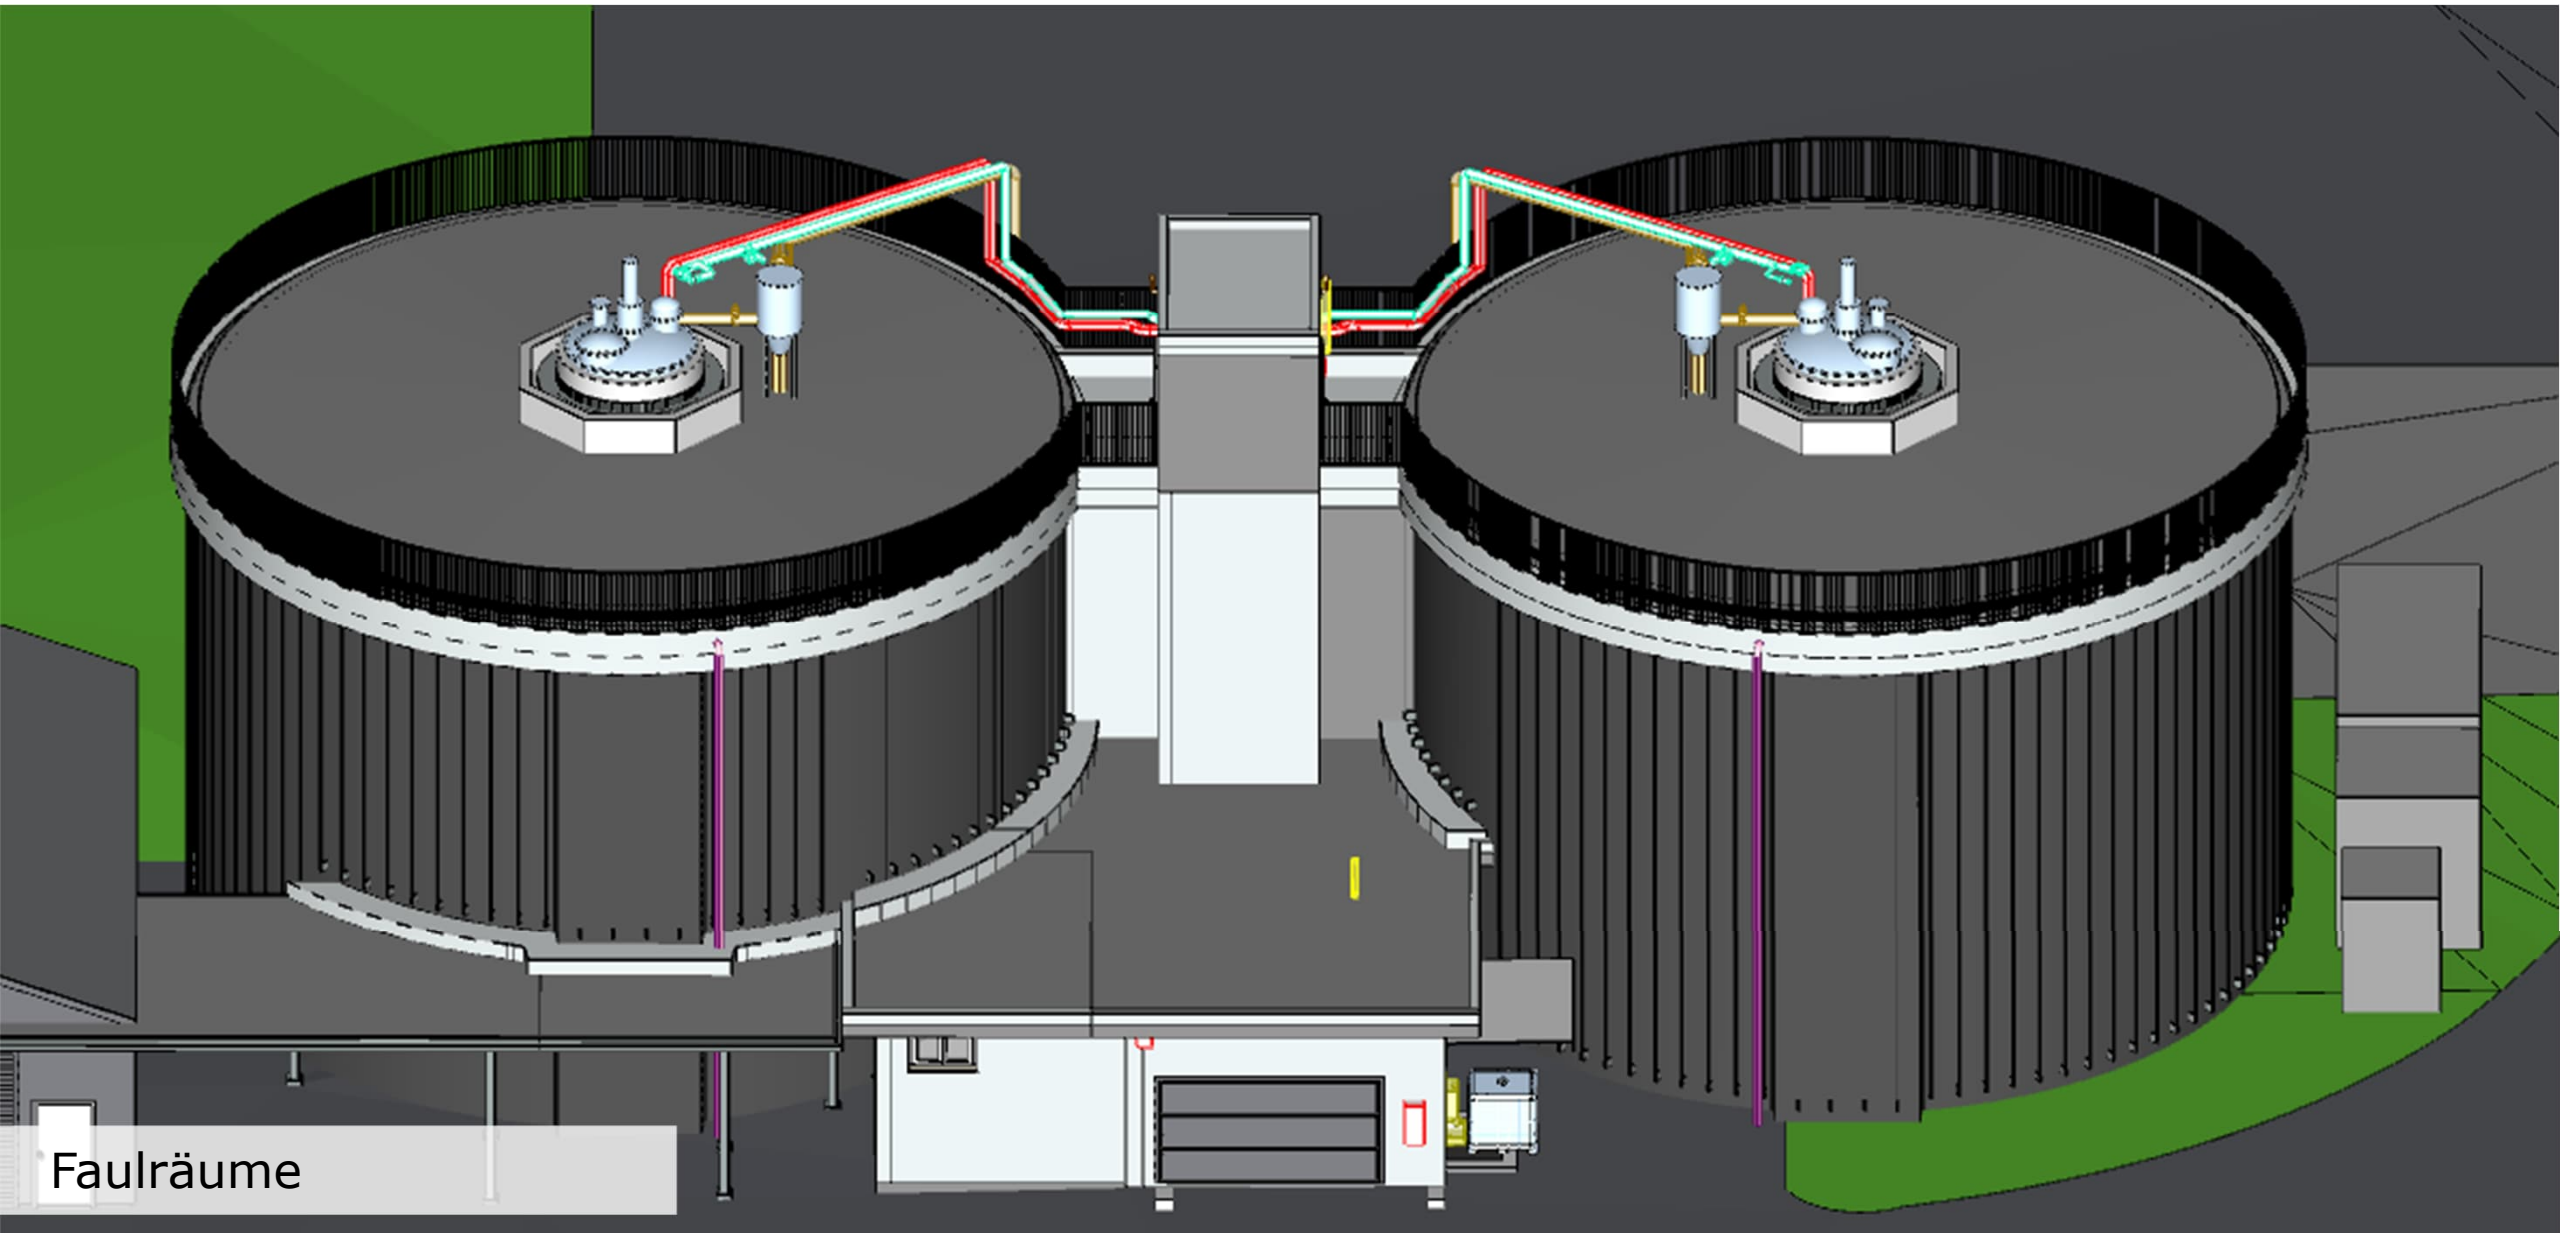

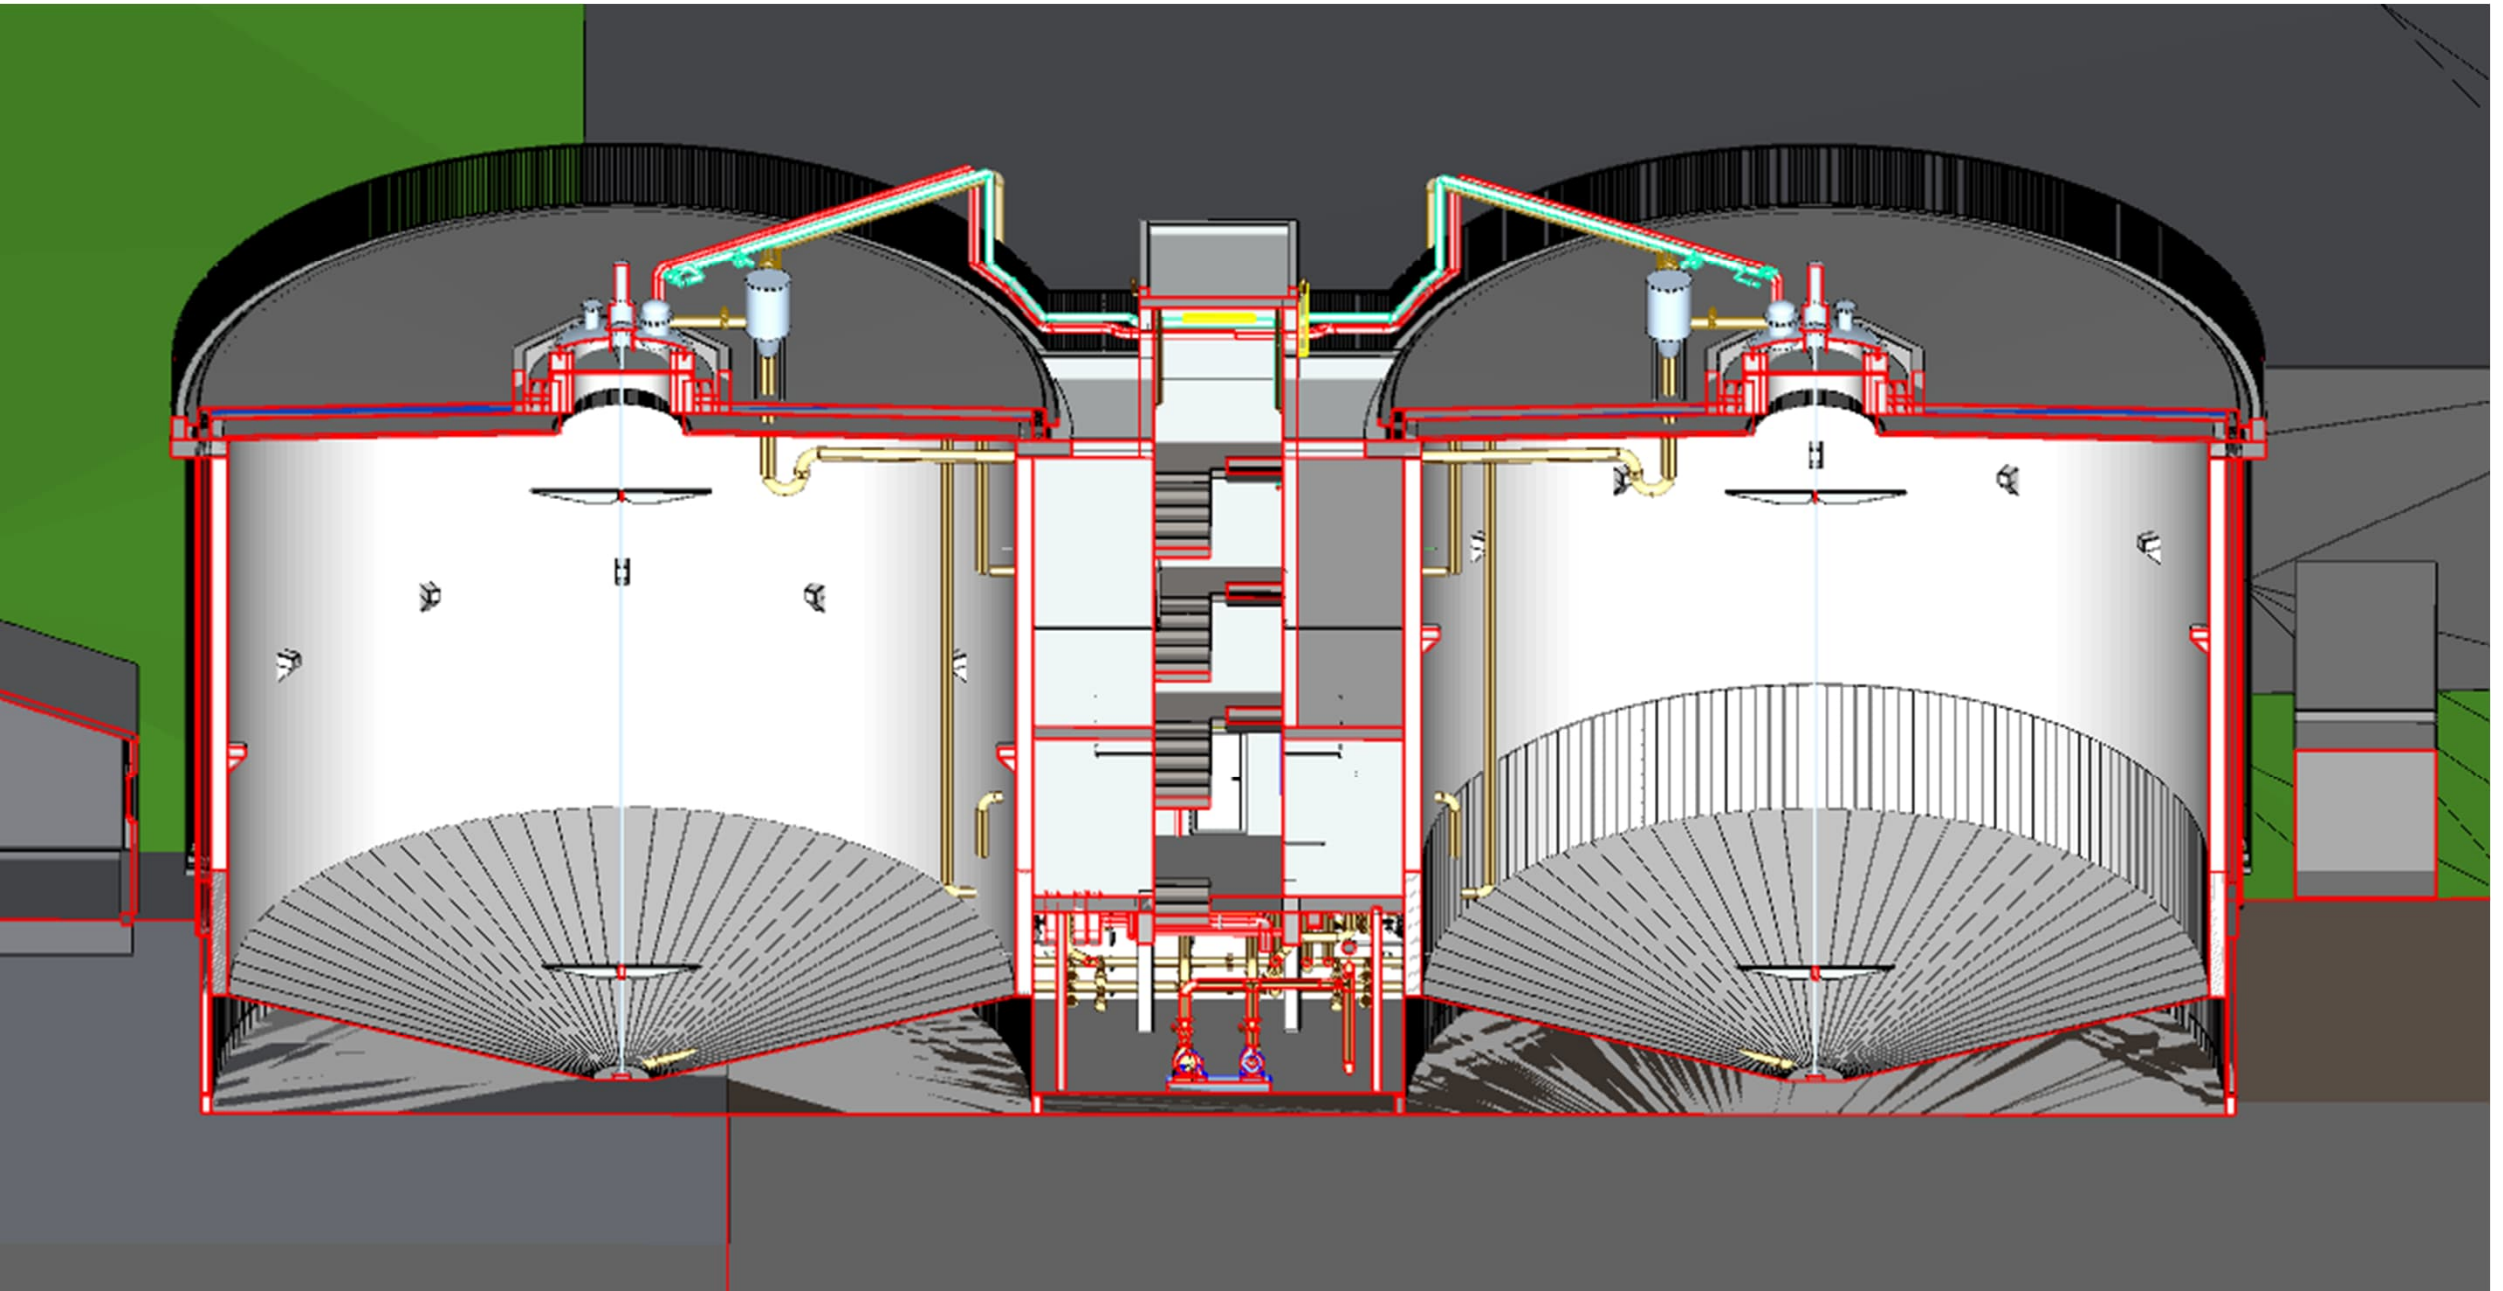


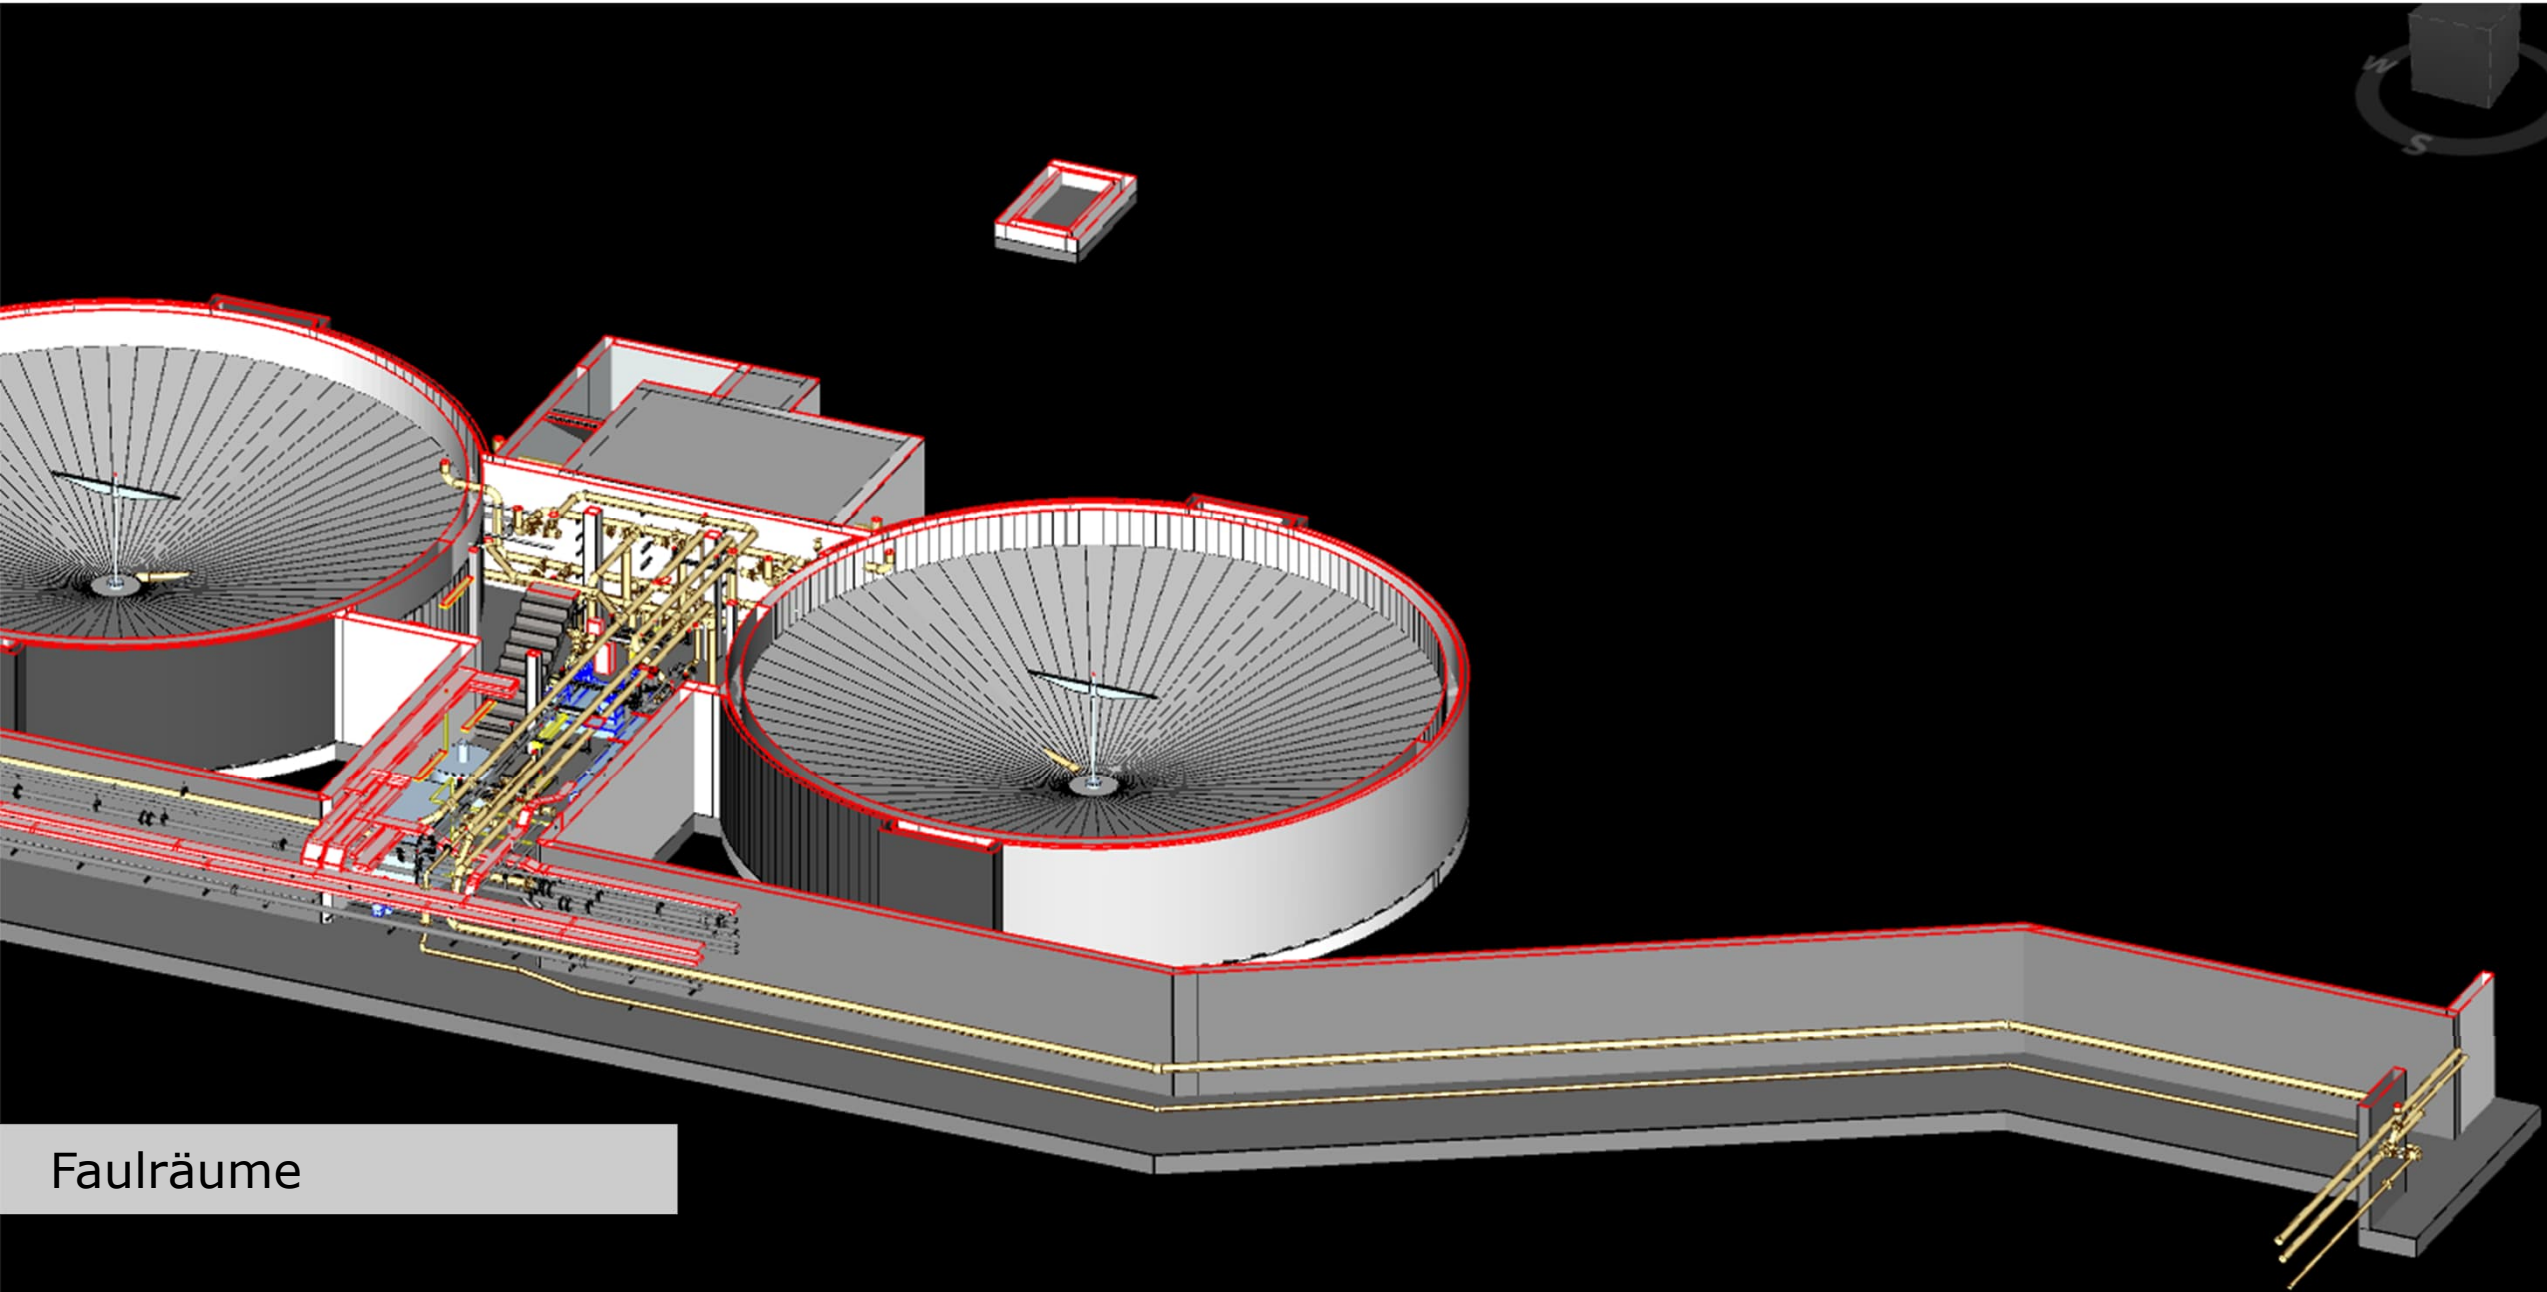


Faulräume

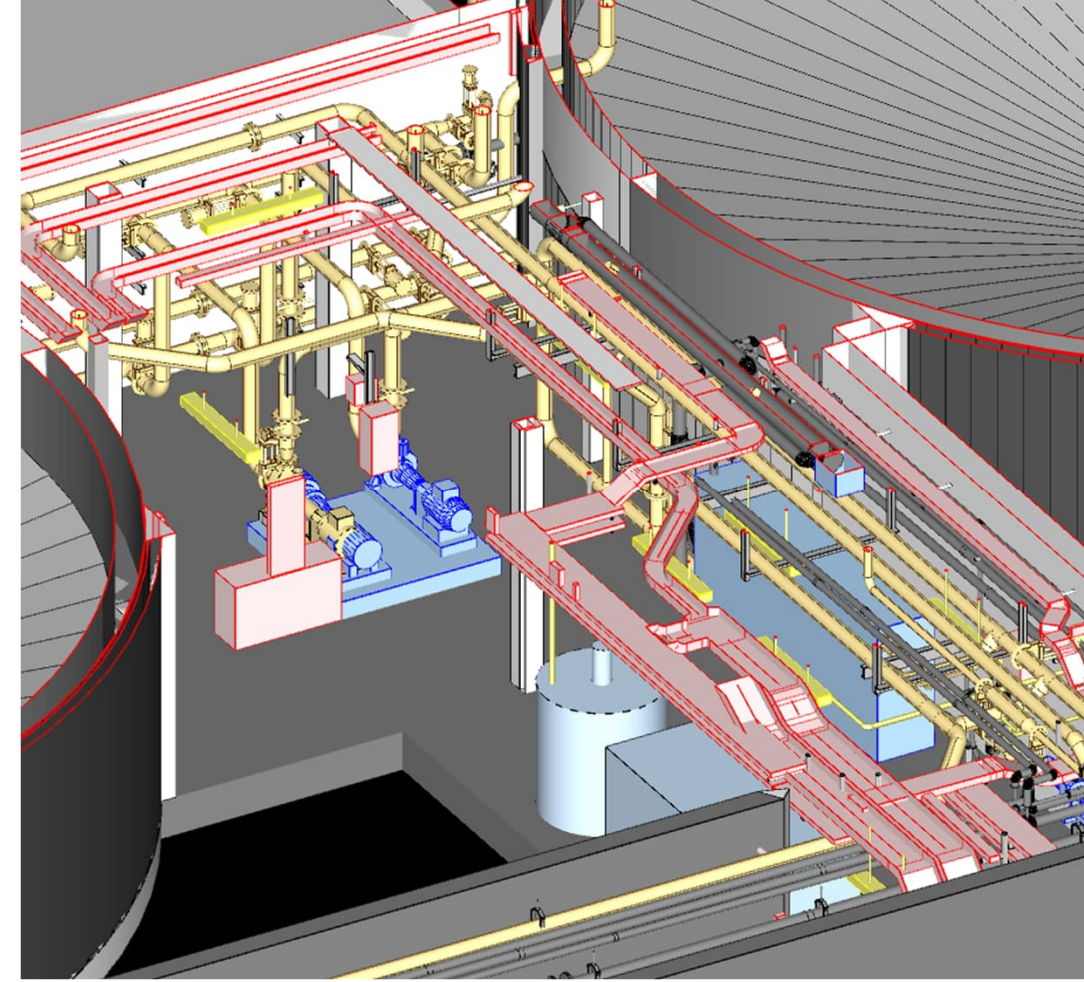

Faulräume – Ersatz Rohrleitungen

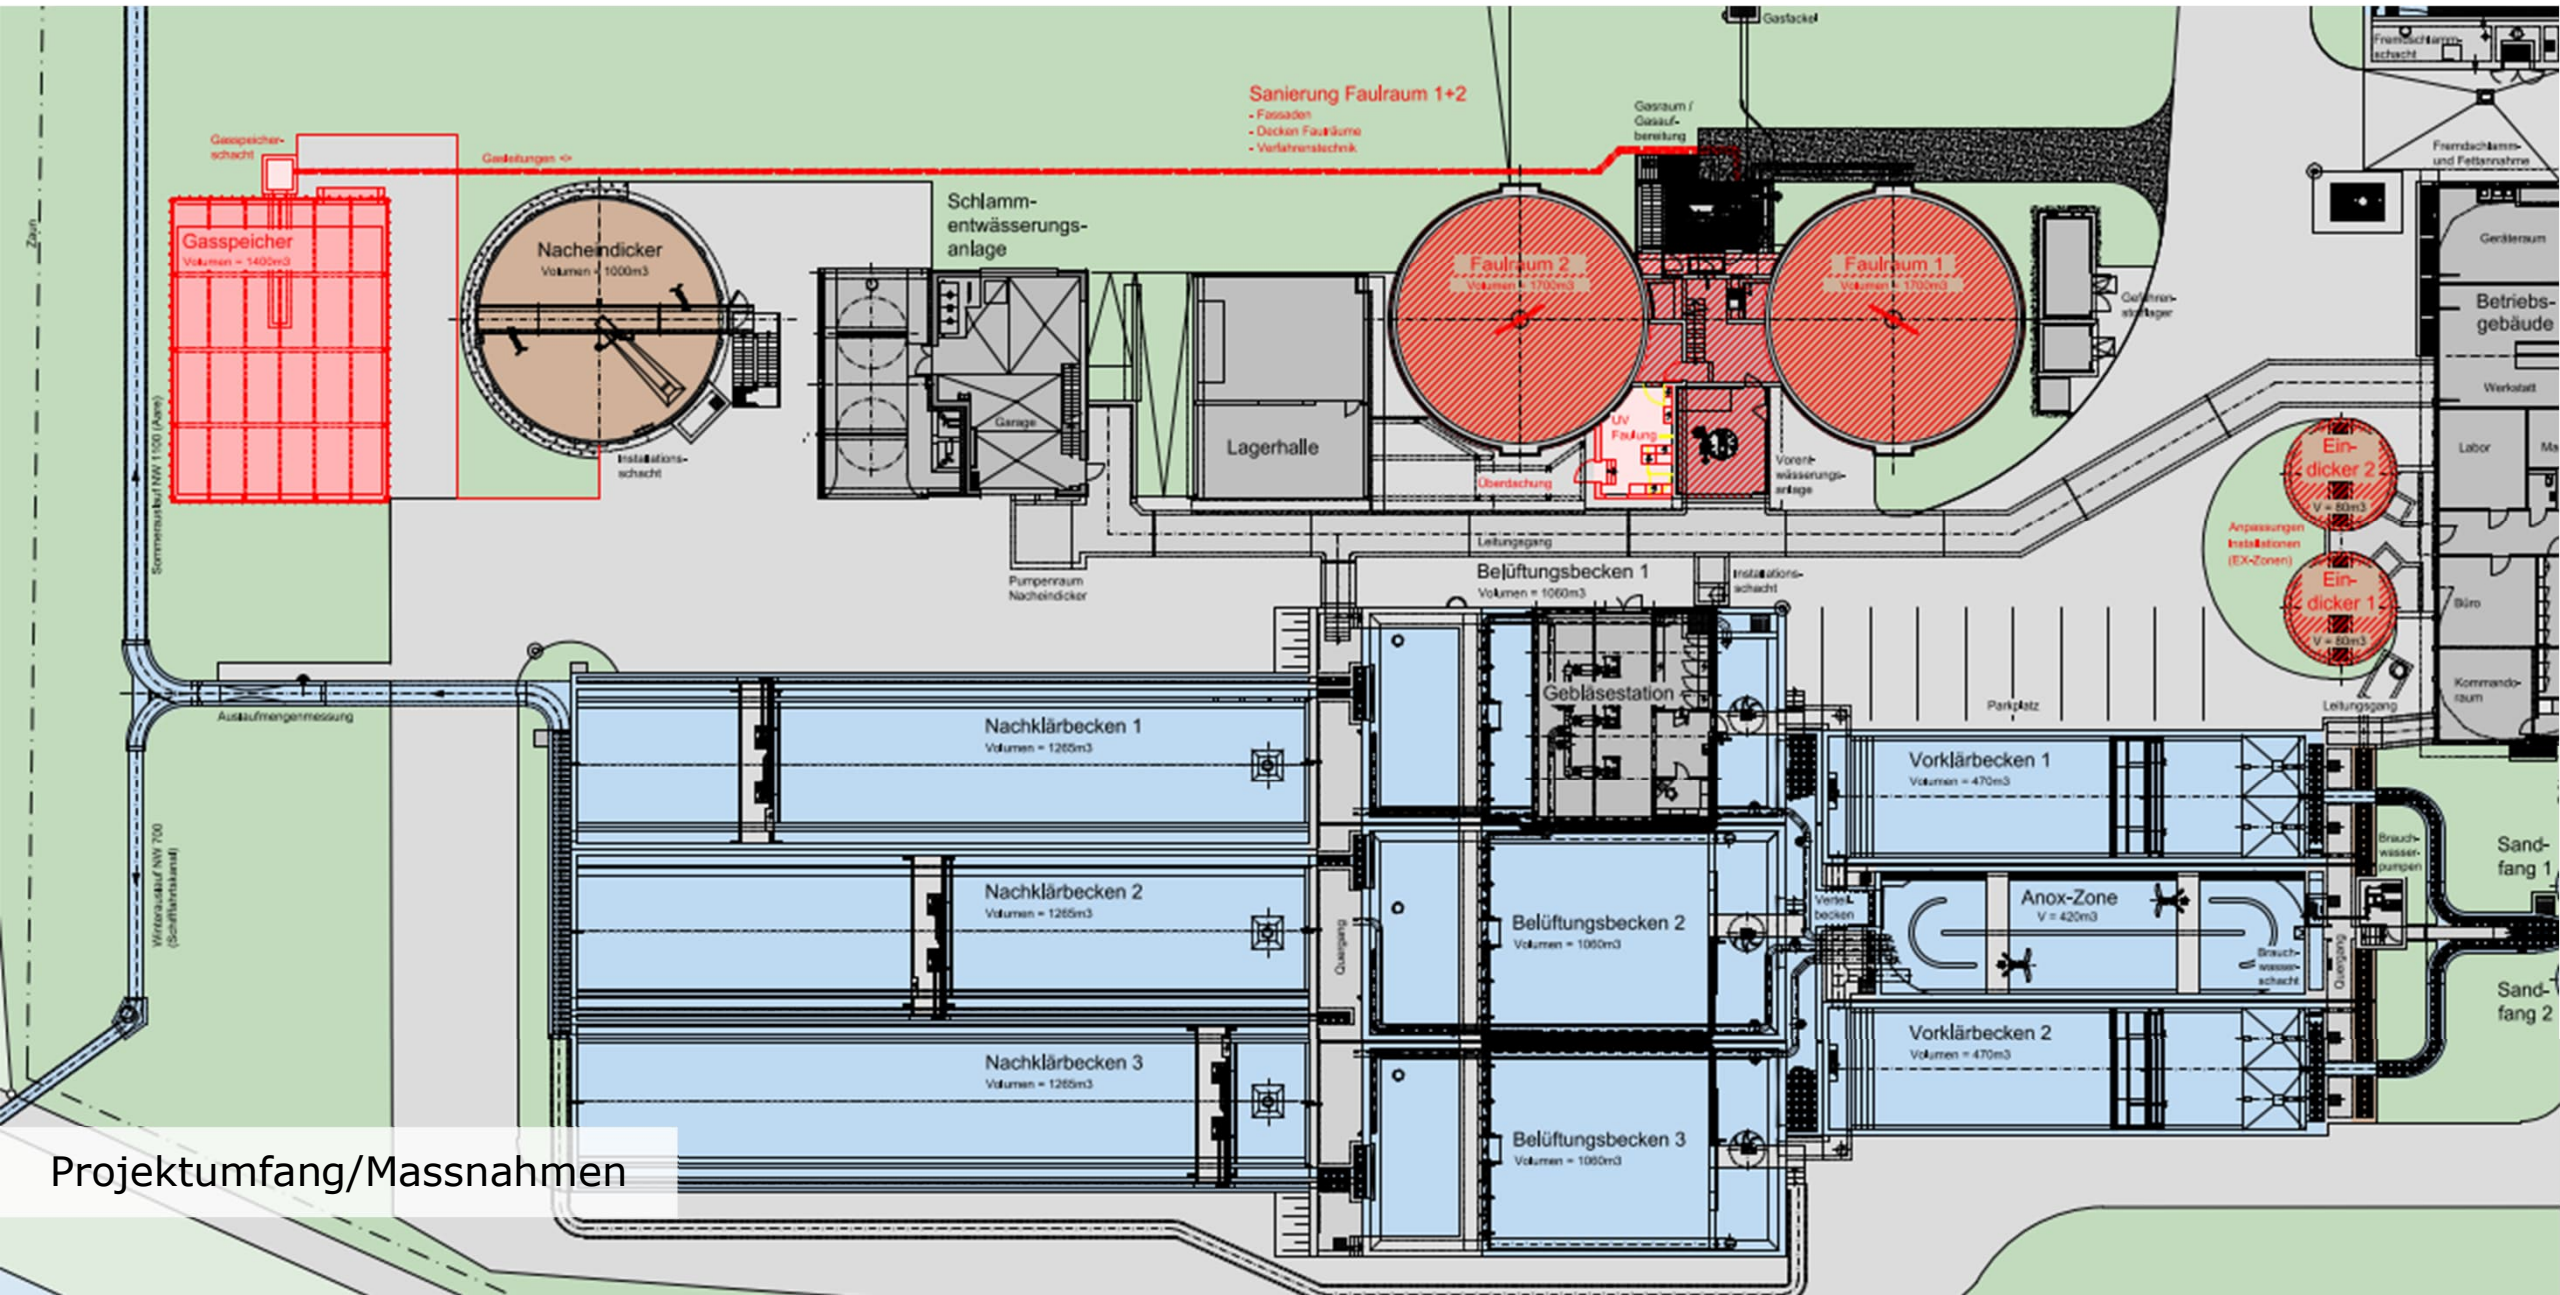

Projektumfang/Massnahmen

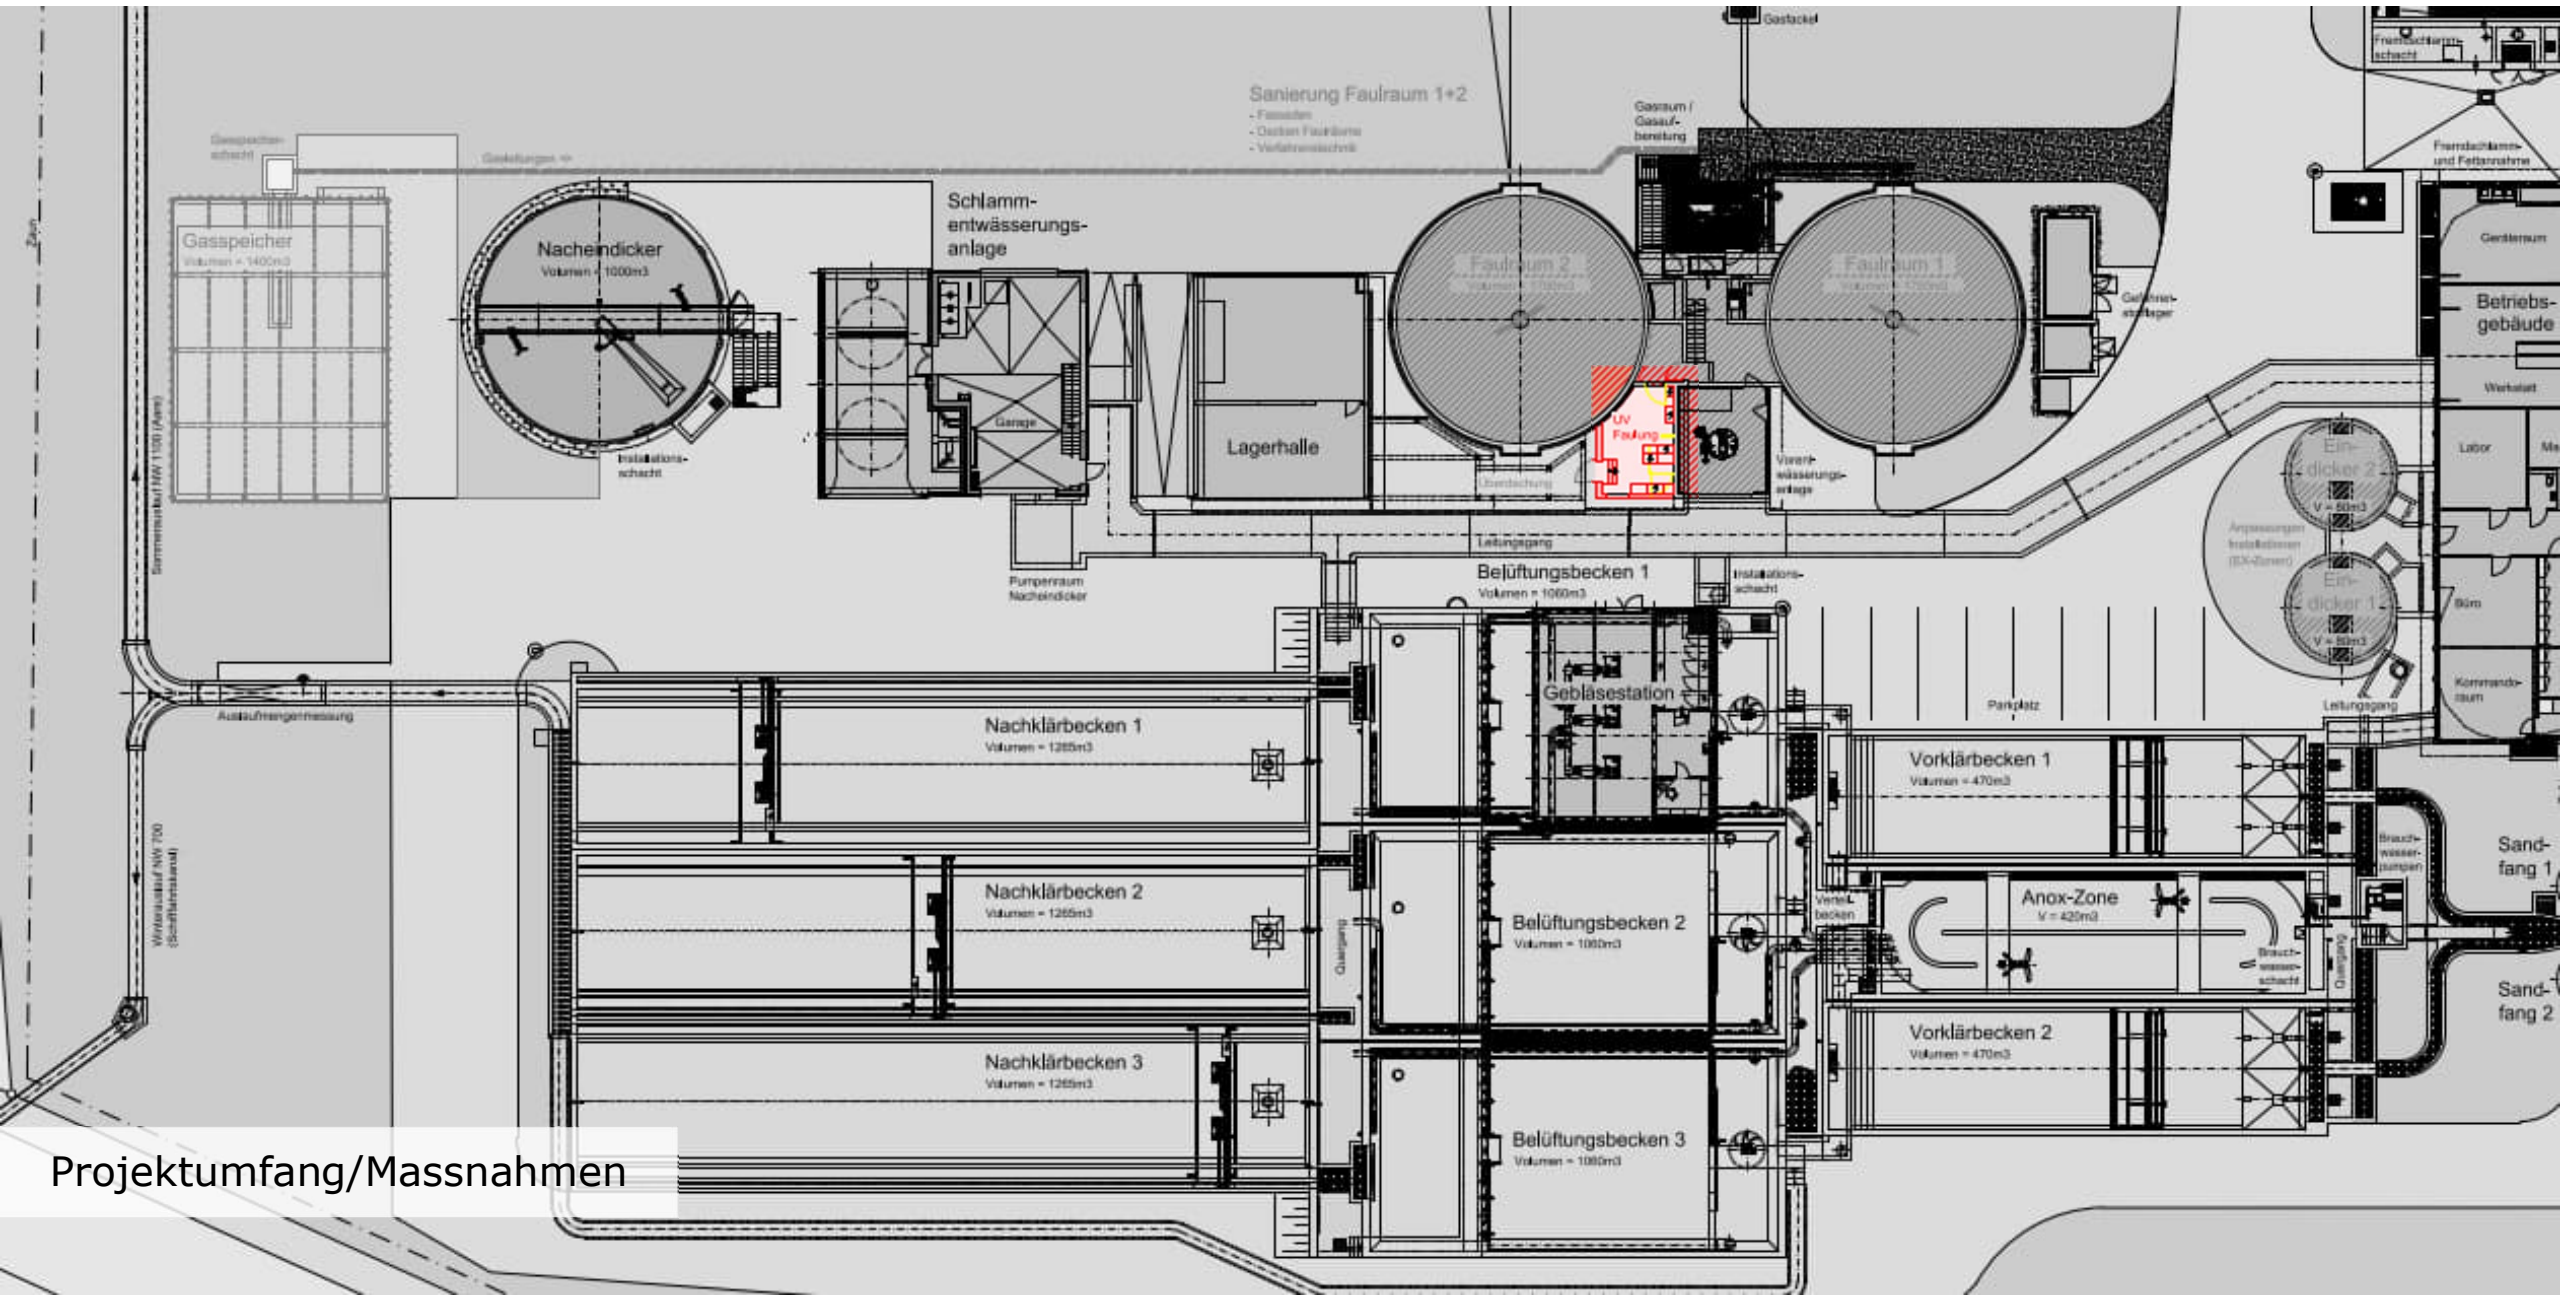

EMSR


Heute:


- Schaltschränke im UG
- Lebensdauer Anlageteile erreicht




Projekt:

- Separater Raum im EG
- Kompletter Ersatz

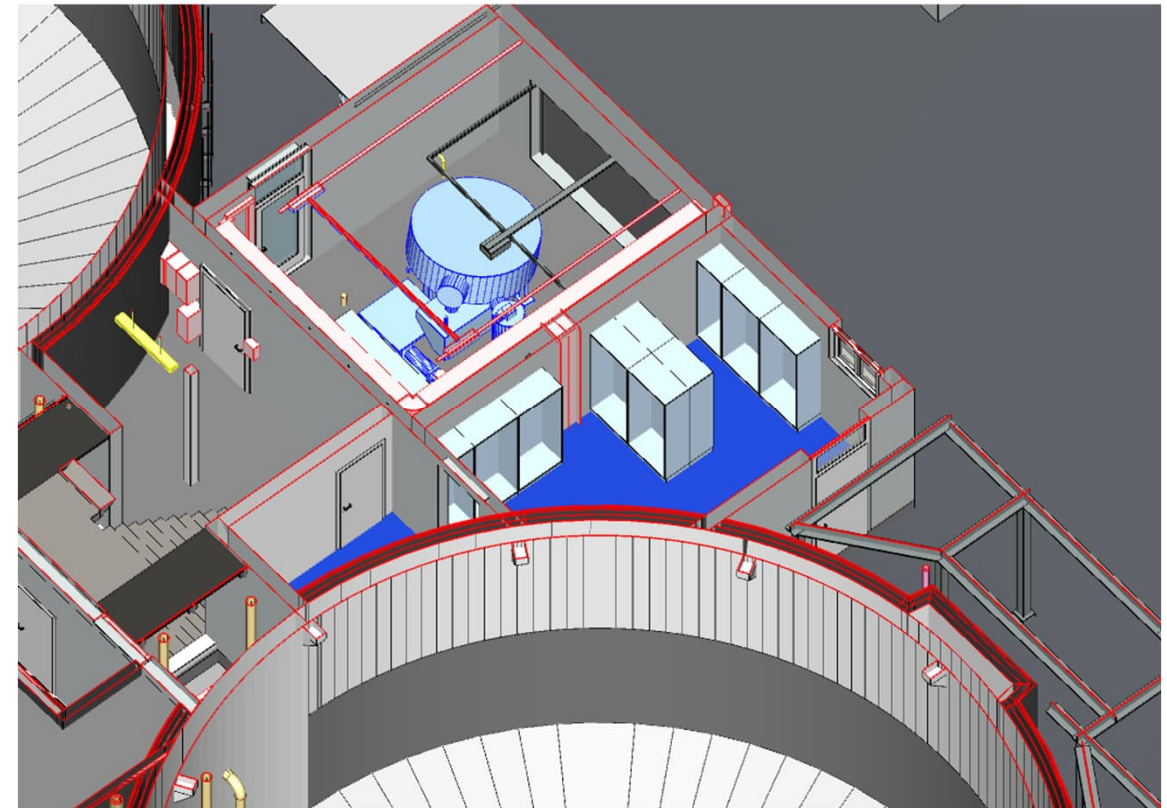

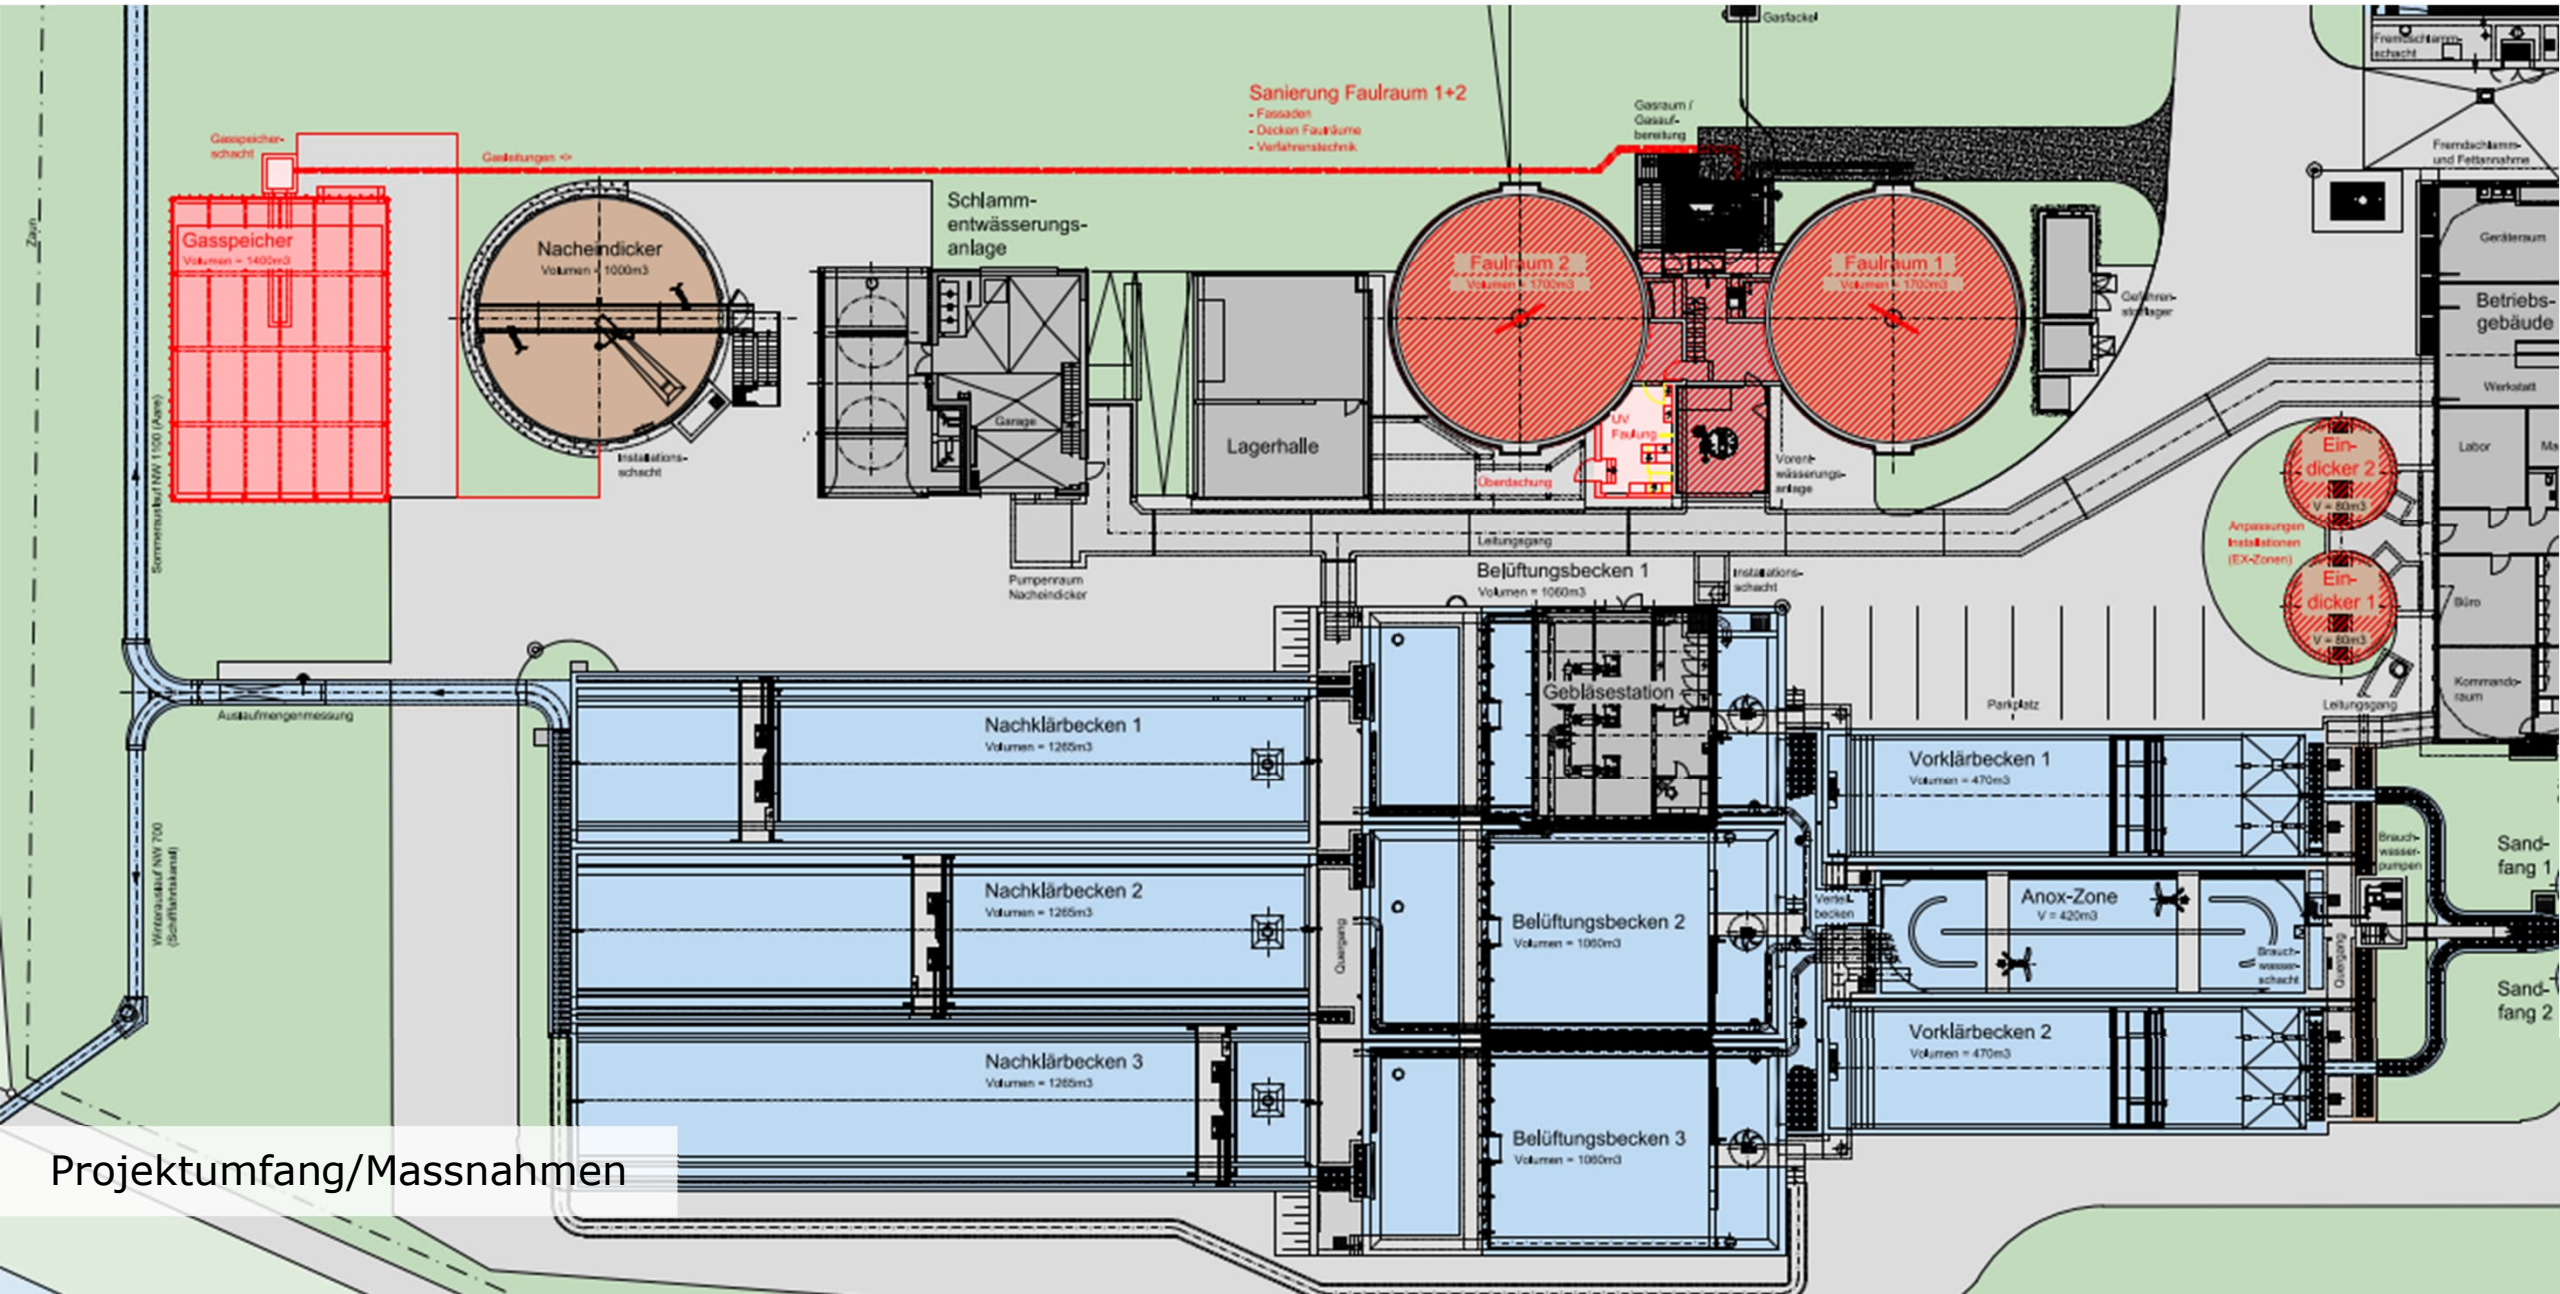

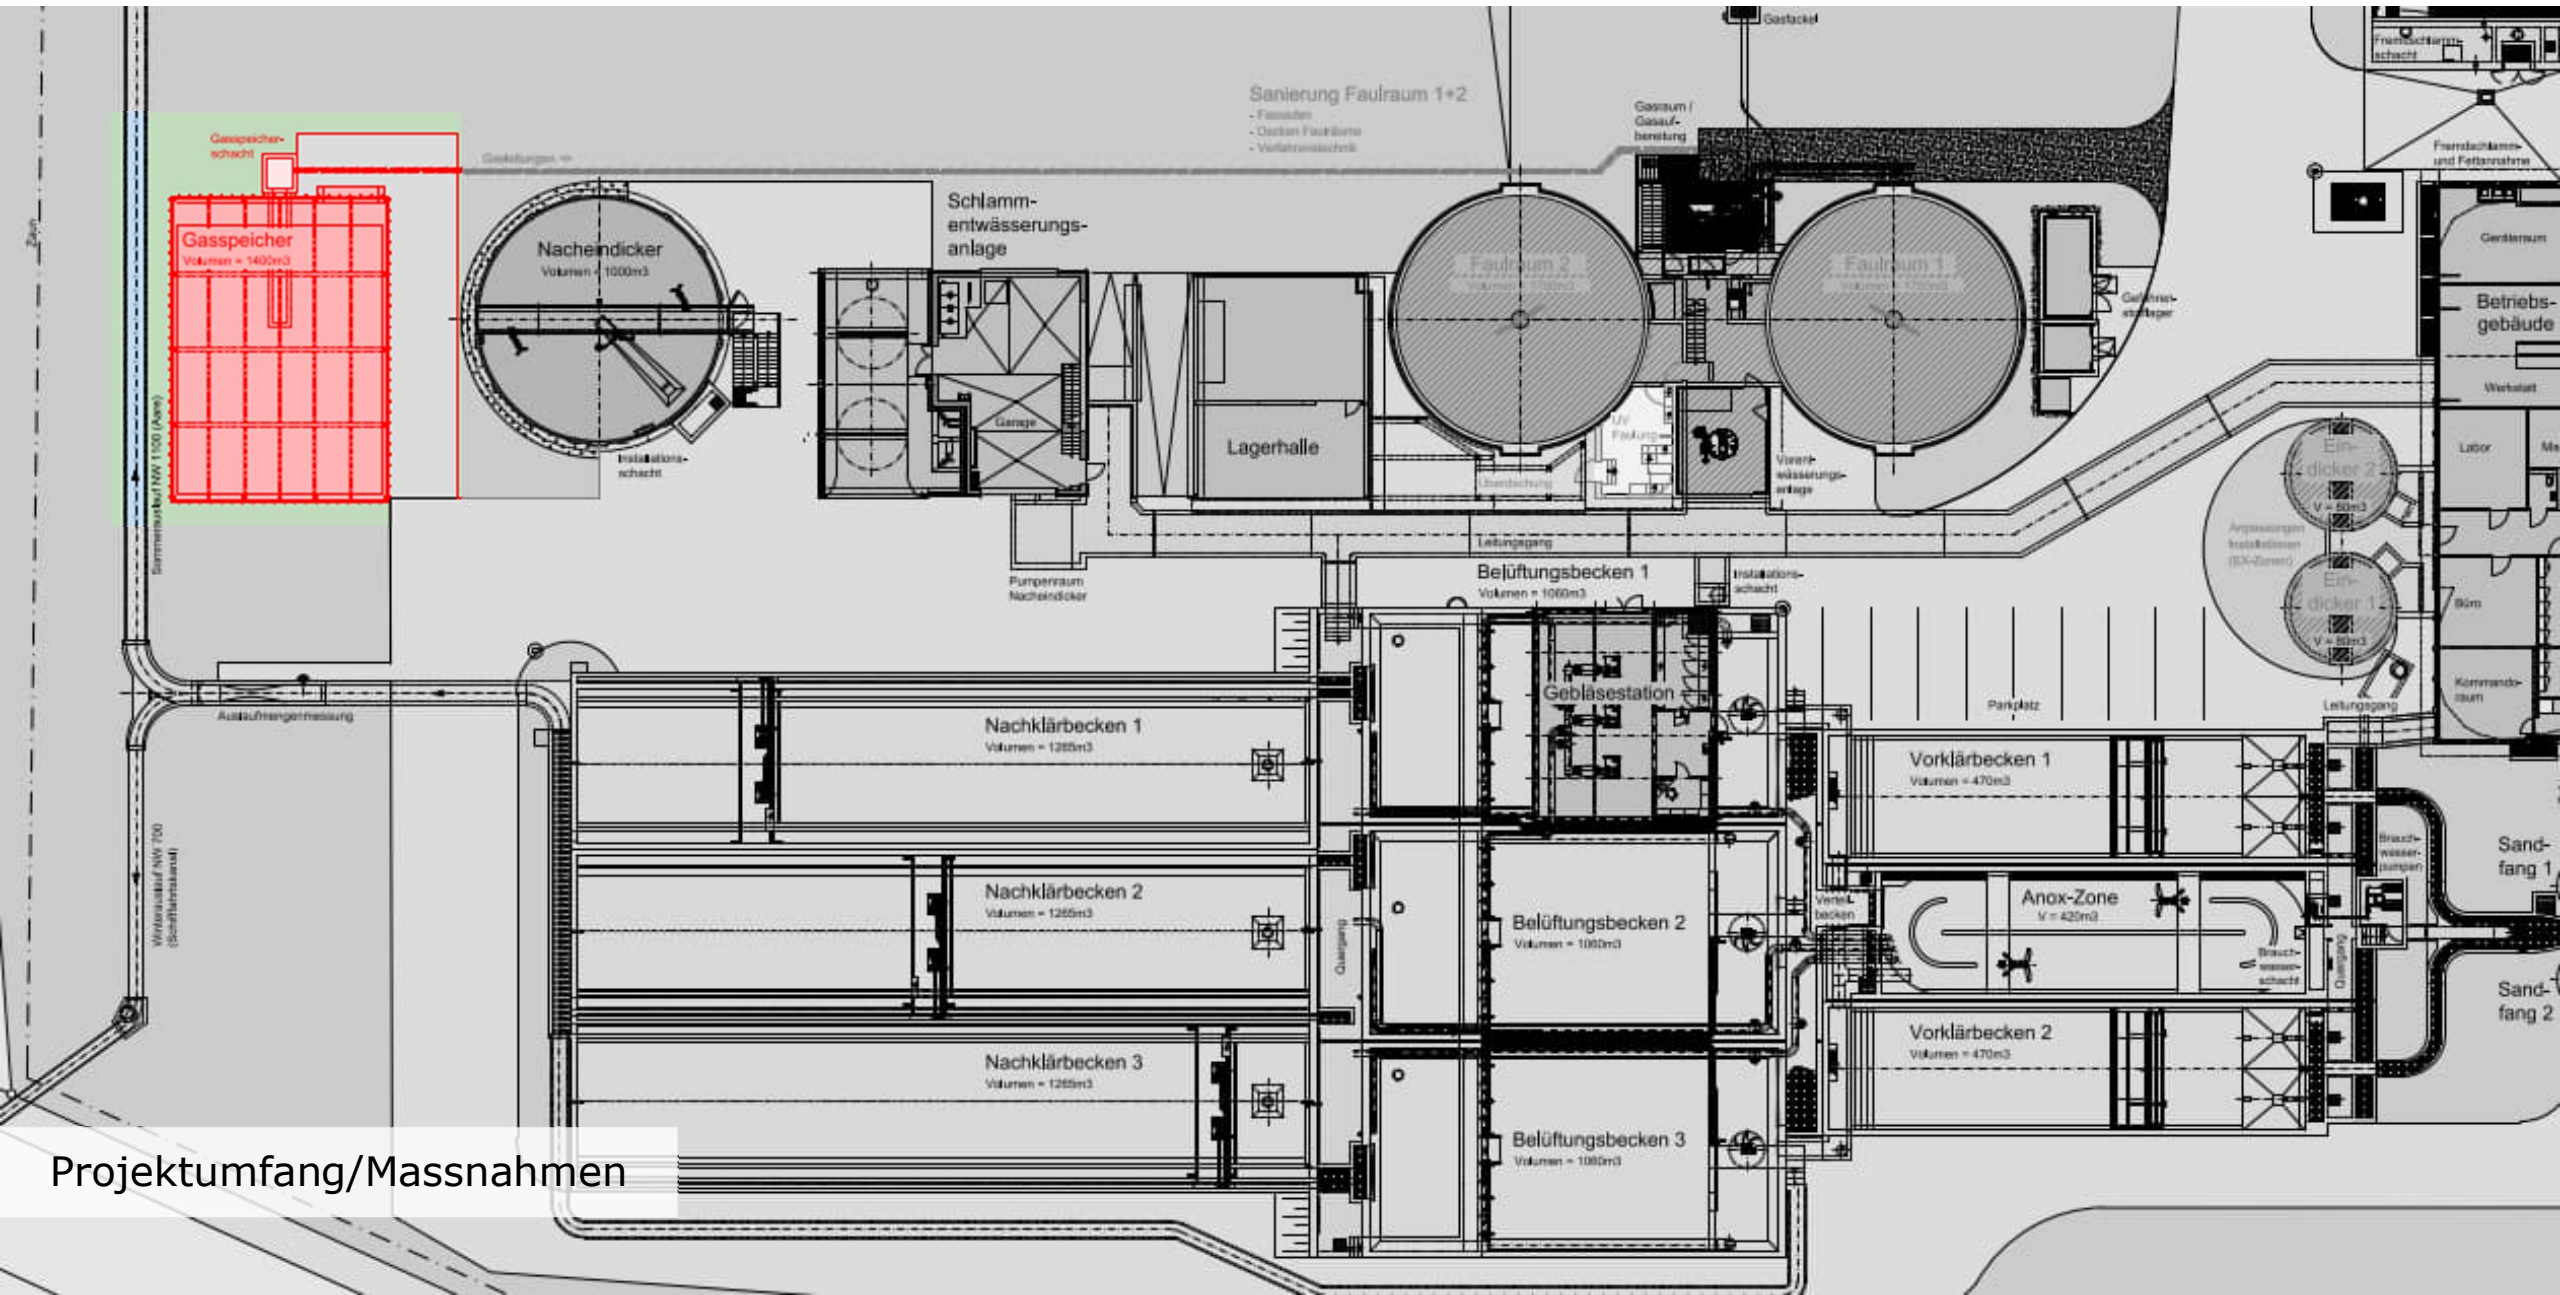


Gasometer


Heute:

- Auf Faulschlamm schwimmend
- Kapazität begrenzt

Projekt:

- Separates Gebäude
- Kapazität vergrößert 500 -> 1'500 m³ (BHKW, PV)

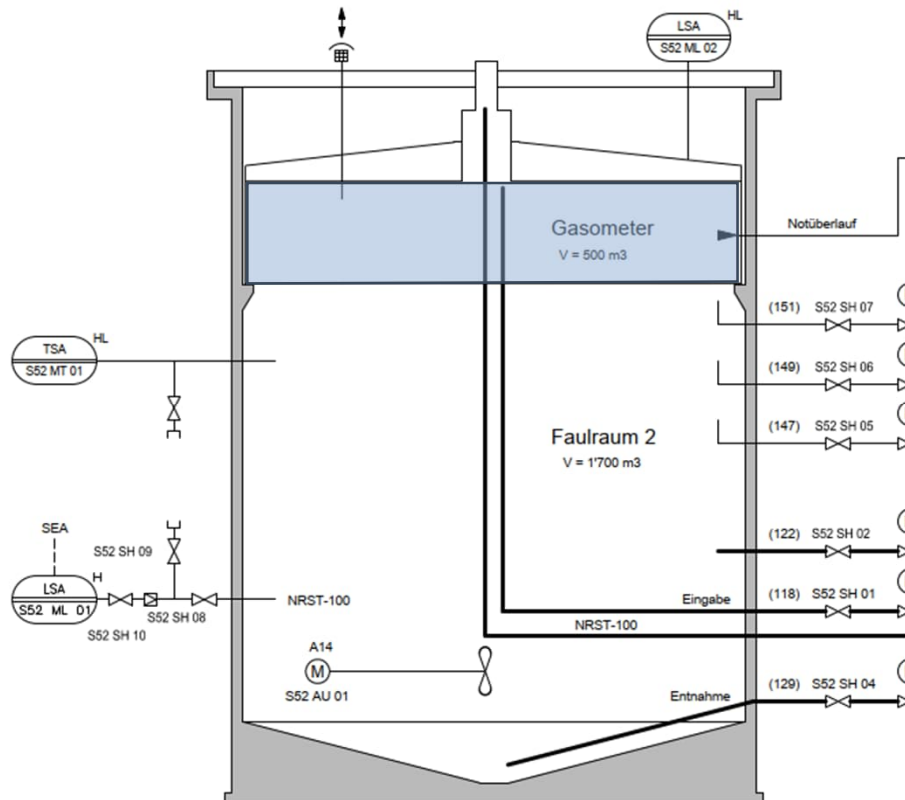

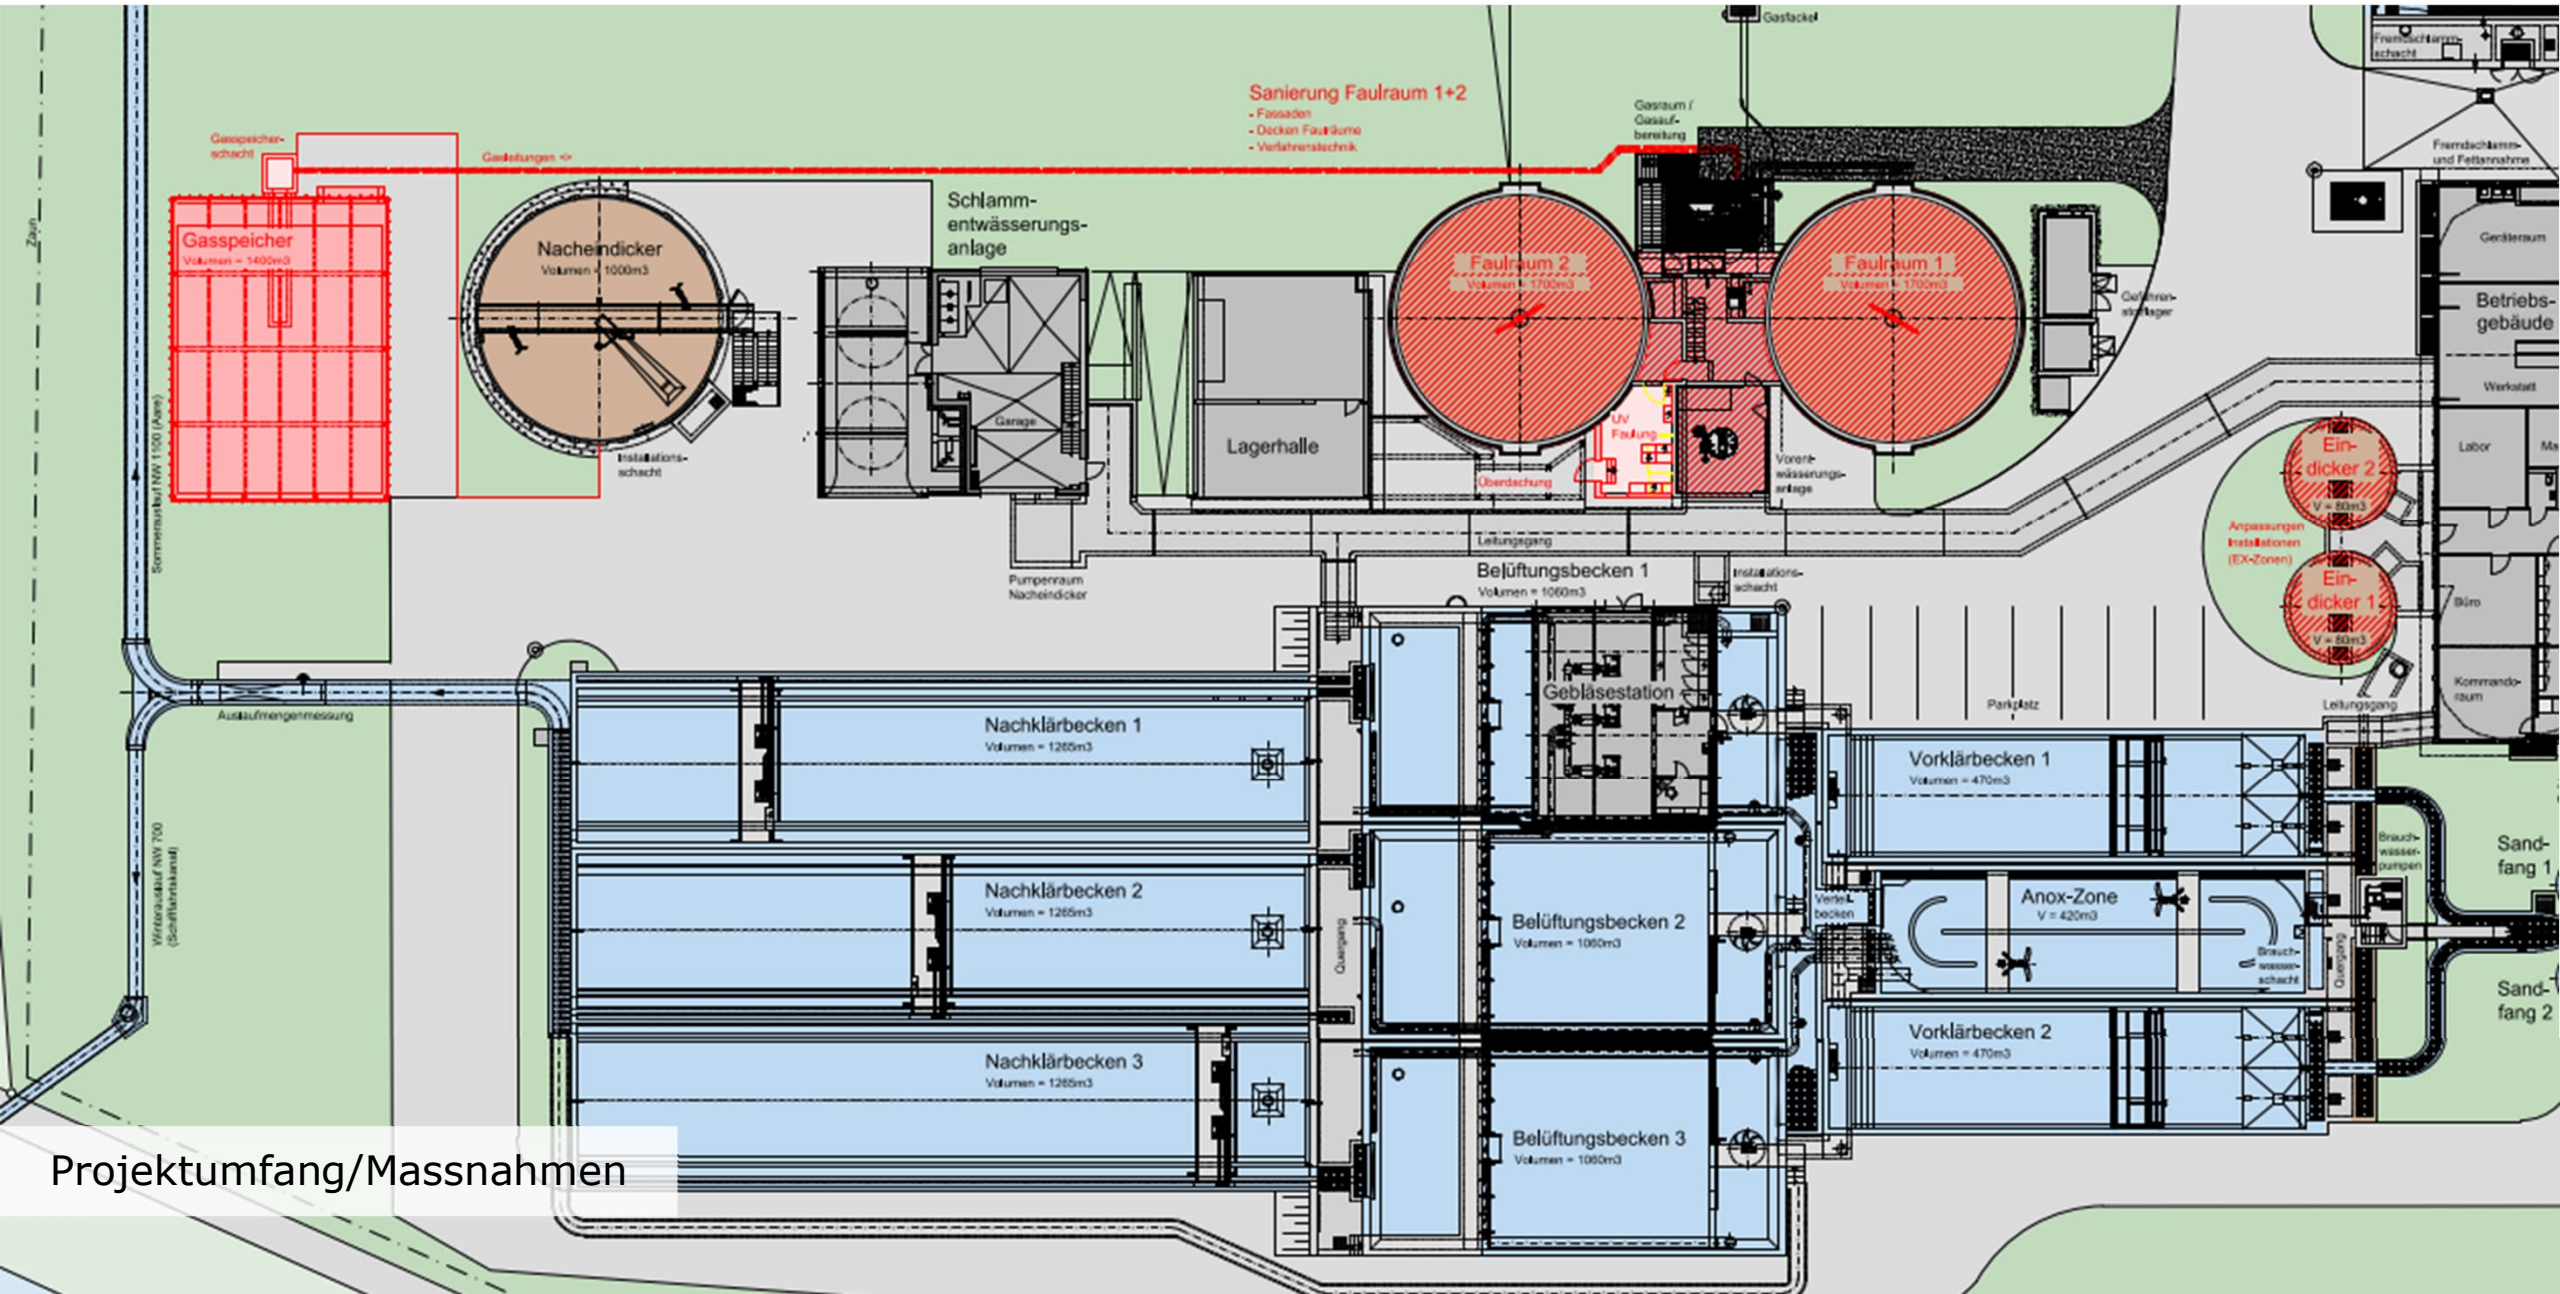


Projektumfang/Massnahmen



Bauablauf

- Umbau unter laufendem Betrieb
- Faulung und Gasometer bleiben in Betrieb
- 1. Etappe: Sanierung Faulraum 1, Neubau Gasometer
- 2. IBN neuer Gasometer, Sanierung Faulraum 2

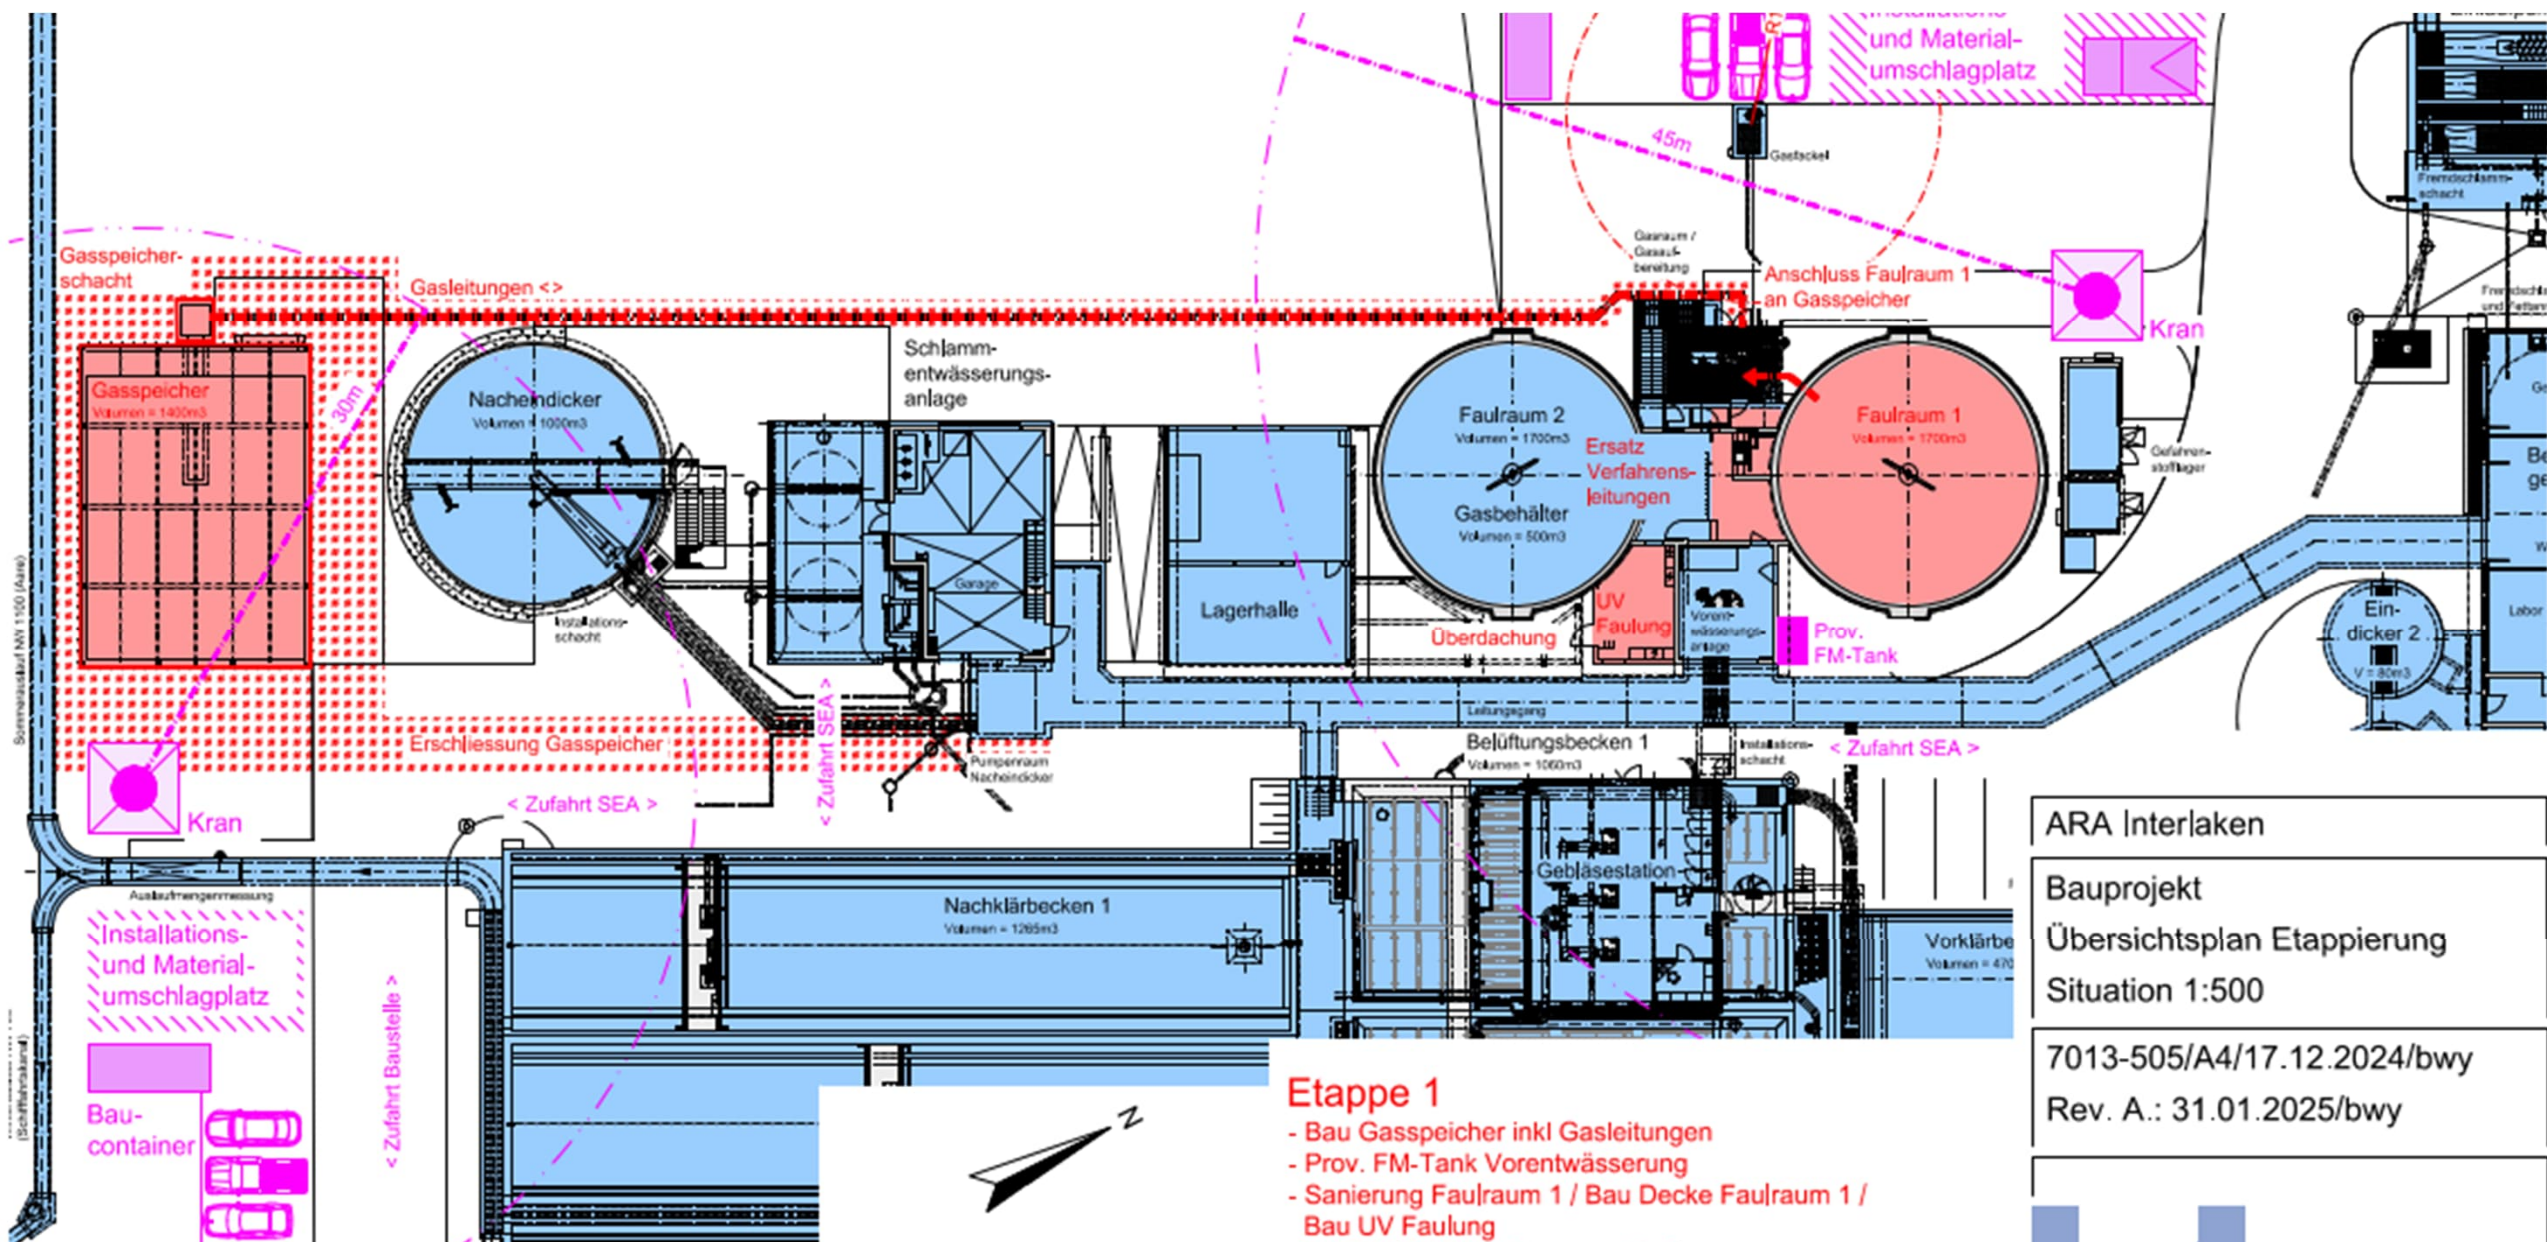

Etappe 1

- Bau Gasspeicher inkl. Gasleitungen
- Prov. FM-Tank Vorentwässerung
- Sanierung Faulraum 1 / Bau Decke Faulraum 1 / Bau UV Faulung

ARA Interlaken


Bauprojekt

Übersichtsplan Etappierung

Situation 1:500

7013-505/A4/17.12.2024/bwy

Rev. A.: 31.01.2025/bwy

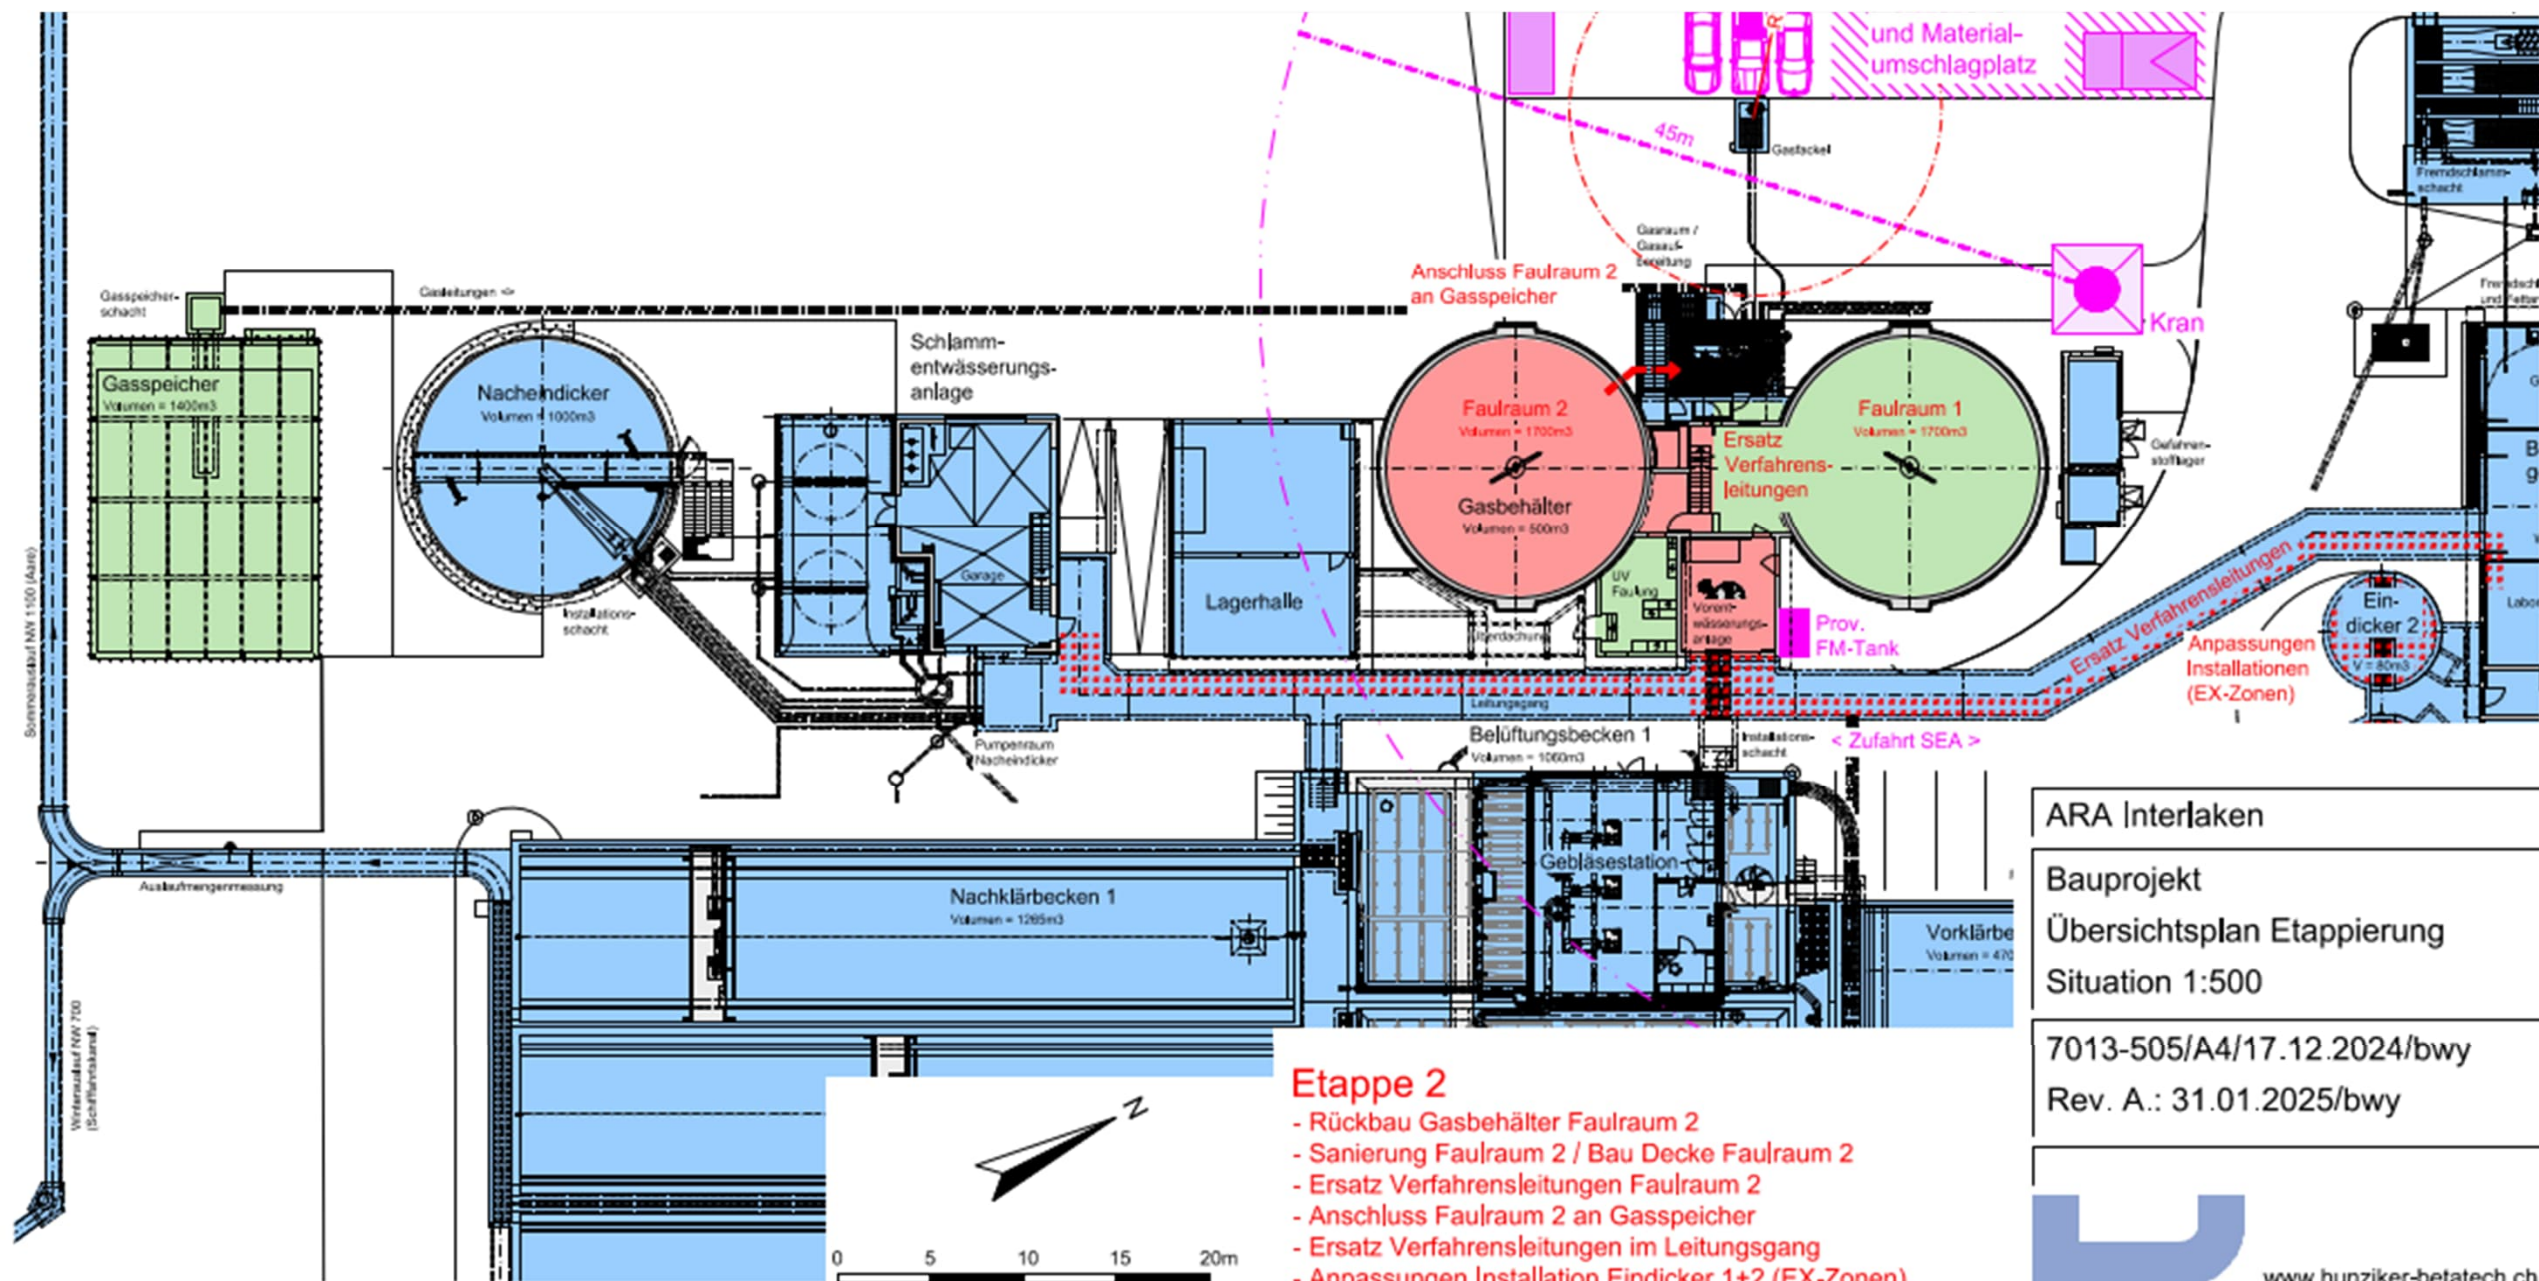



Kostenvoranschlag +/-10%

BKP	Bezeichnung	Kosten (CHF exkl. MWST)
0	Grundstück	14'000
1	Vorbereitungsarbeiten	220'000
2	Gebäude	3'296'000
4	Umgebung	30'000
5	Baunebenkosten	1'138'000
6	Verfahrenstechnik	770'000
9	UVG	550'000
	Total (exkl. MWST)	6'018'000
	Total (inkl. 8.1% MWST)	6'505'458



mögliche Beiträge



Stiftung

KLIK Schweiz

KLIK International

News

Unternehmen

Programm

Methanreduktion in ARAs

Methan in Abluftströmen von kommunalen Kläranlagen zerstören oder nutzen

Schweiz | Unternehmen | **Methanreduktion in ARA**

[< zurück](#)



Partner
Programm

Dieses Programm richtet sich an



Mehr erfahren

Infos zum Förderprogramm ➤

Anmelden

Zur Anmeldung ➤

south pole

Programmeigner

South Pole

Clara Baumhauer

E-Mail



Verantwortlich bei KLIK

Darja Aepli

Leiterin Inland



HUNZIKER BETATECH

EINFACH.
MEHR.
IDEEN.

www.hunziker-betatech.ch
